

OUTIL DE DIAGNOSTIC

MONTONI

Parcours de démonstration · Initiative IA

30 entrevues · 14 départements · avril à juillet 2026

30

ENTREVUES RÉALISÉES
D'AVRIL À JUILLET 2026

14

DÉPARTEMENTS
RENCONTRÉS

Toutes les découvertes ont été centralisées
dans cet outil de diagnostic.



BIENVENUE À L'OUTIL DE DIAGNOSTIC DE

MONTONI

ACCÉDER

BIENVENUE À L'OUTIL DE DIAGNOSTIC DE

MONTONI

ACCÈS RÉSERVÉ


Connexion

NOM D'UTILISATEUR

MOT DE PASSE

ACCÉDER

ANNULER

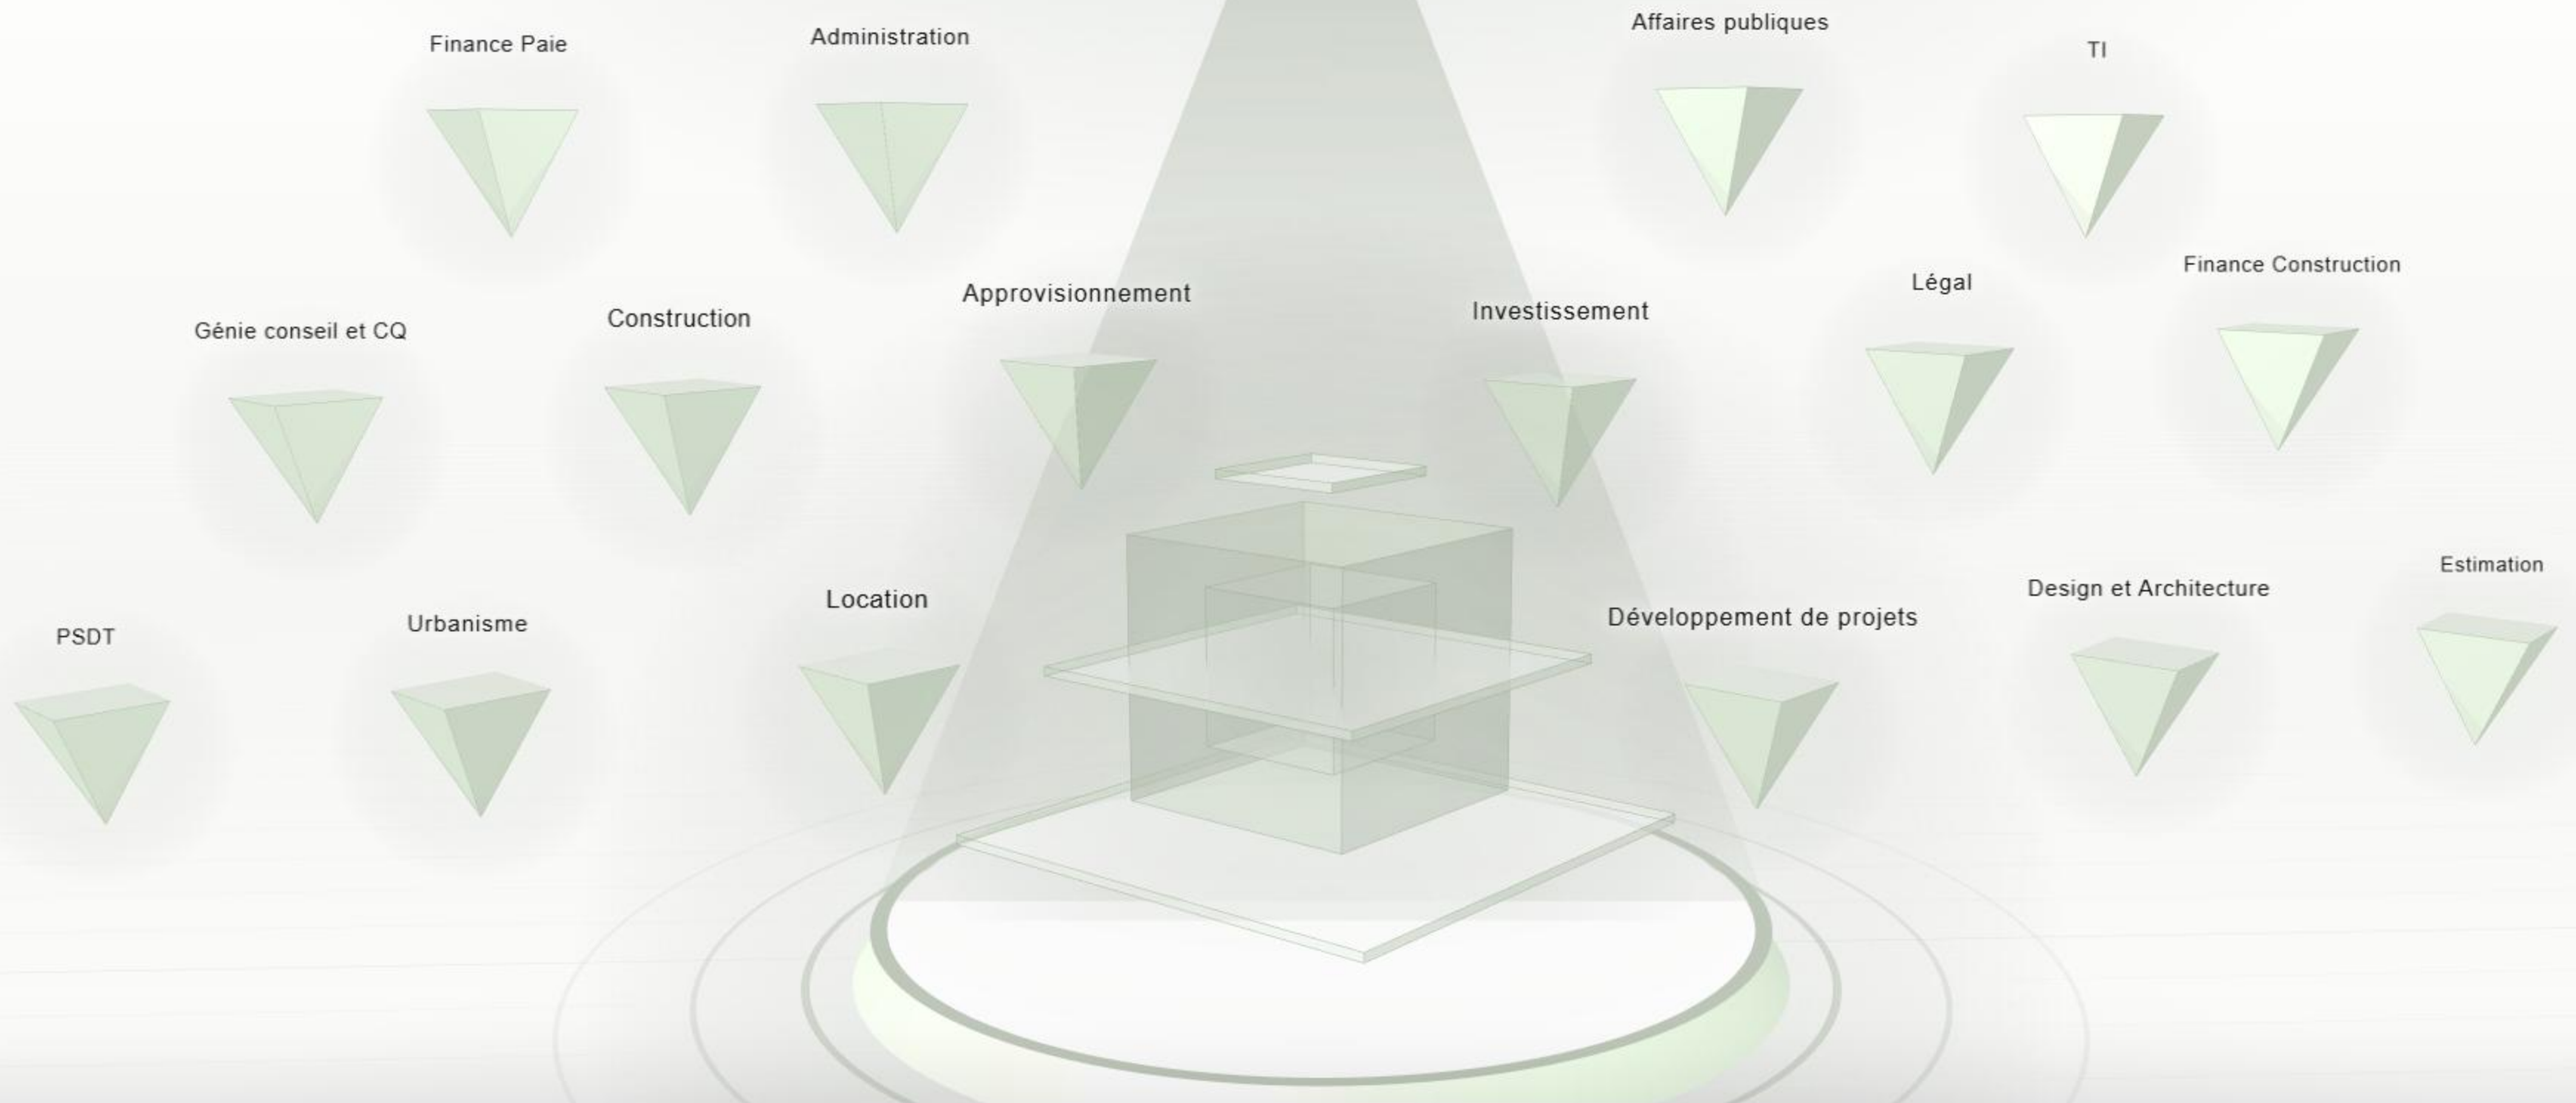

ENTREVUES PRÉLIMINAIRES

Les entrevues préliminaires ont permis d'avoir une vue d'ensemble des processus de l'entreprise afin d'identifier :



Les étapes
DE CHAQUE PROCESSUS



Les documents
INTRANTS ET EXTRANTS



Les systèmes
UTILISÉS



Les personnes
IMPLIQUÉES





DÉPARTEMENT

Développement de projets

OBJECTIFS


- 1 Convertir les opportunités en contrats signés ▶
- 2 Transférer à l'exécution des projets complets, avec contrat, budget, portée et échéancier arrêtés ▶
- 3 Respecter la marge et l'échéancier engagés auprès du client ▶
- 4 Réduire les reprises liées aux itérations client ▼
- Heures par itération

RESSOURCES HUMAINES ▶

PROCESSUS ▶

DIAGNOSTICS ▶

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS

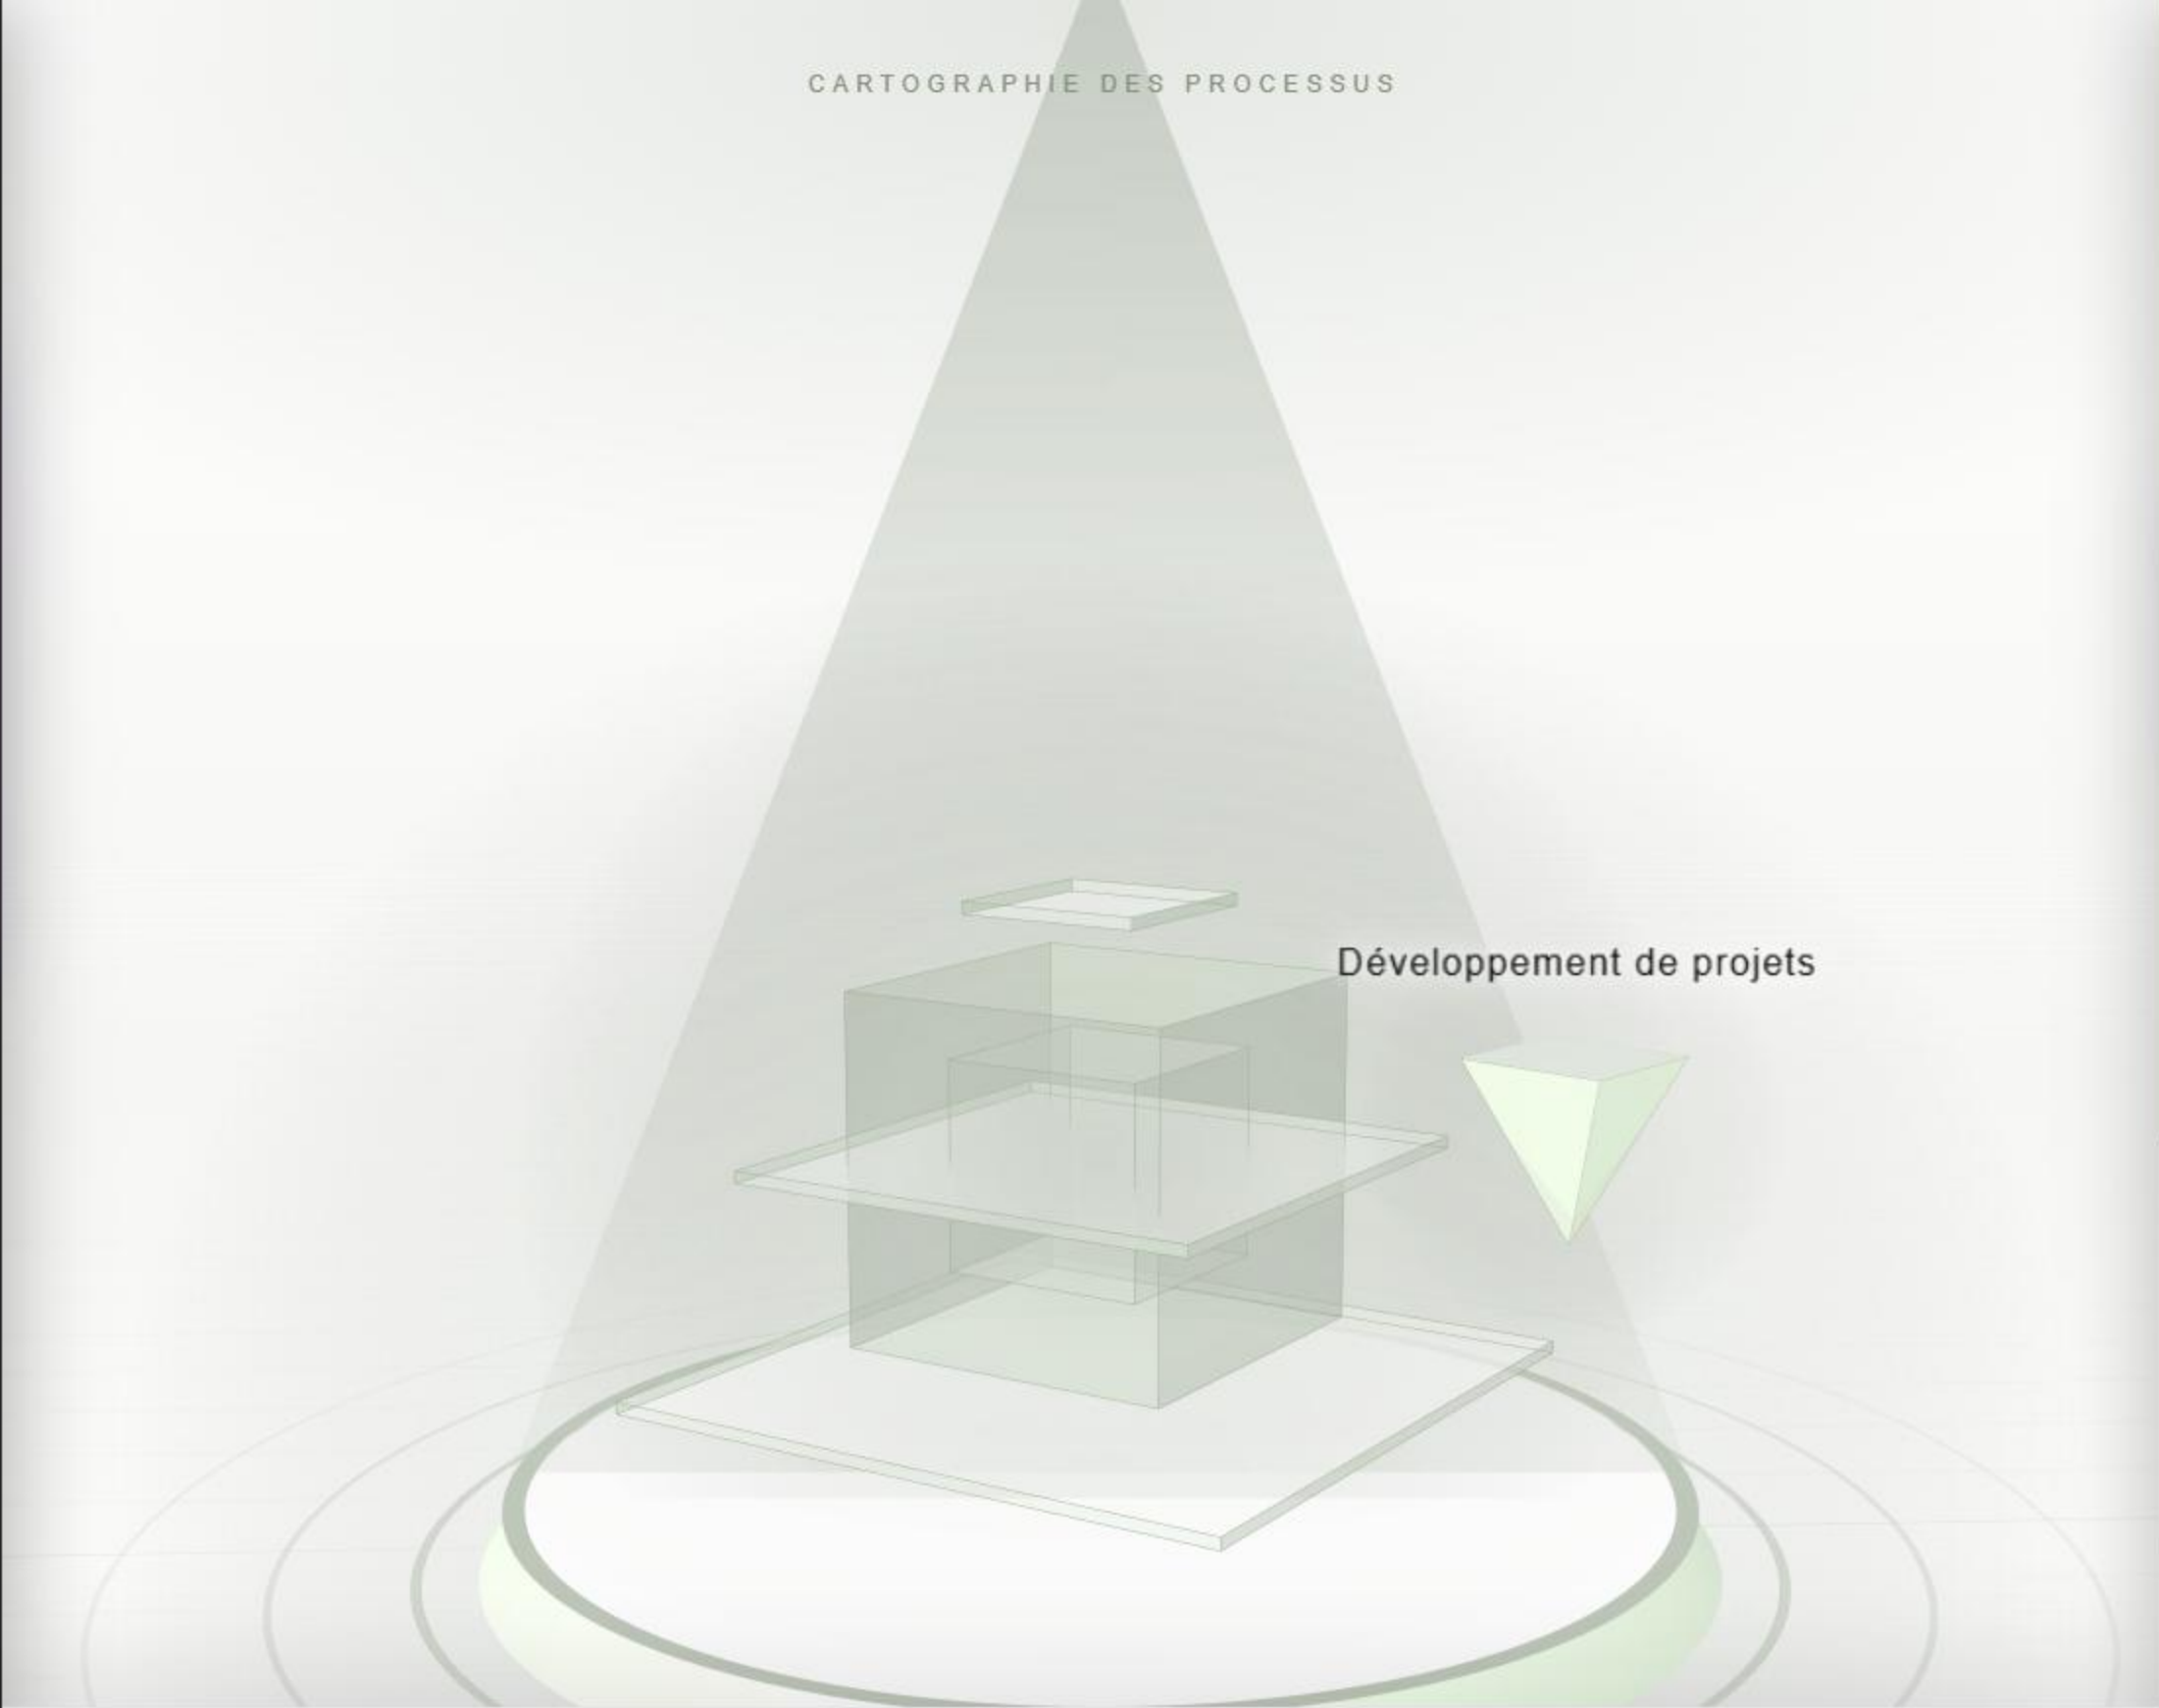

TABEAU DE BORD

INDICATEUR CIBLE

Heures par itération

50 à 60 heures
par itération



DONNÉE RÉELLE

100 heures par
itération



OBJECTIFS ET INDICATEURS

À partir des entrevues retranscrites, des hypothèses d'objectifs départementaux ont été établies et des indicateurs de performance identifiés, avec des hypothèses de cible chiffrée.



Hypothèses d'objectifs
PAR DÉPARTEMENT



Indicateurs de performance
IDENTIFIÉS EN ENTREVUE



Hypothèses de cible
CHIFFRÉES



X

DÉPARTEMENT

Développement de projets

OBJECTIFS

RESSOURCES HUMAINES

PROCESSUS

Préconstruction d'un projet
11 étapes

Réponse à un appel d'offres client
3 étapes

DIAGNOSTICS


PROCESSUS

Préconstruction d'un projet

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

TABEAU DE BORD

Événement Étape Qui exécute Document entrant, document sortant Système

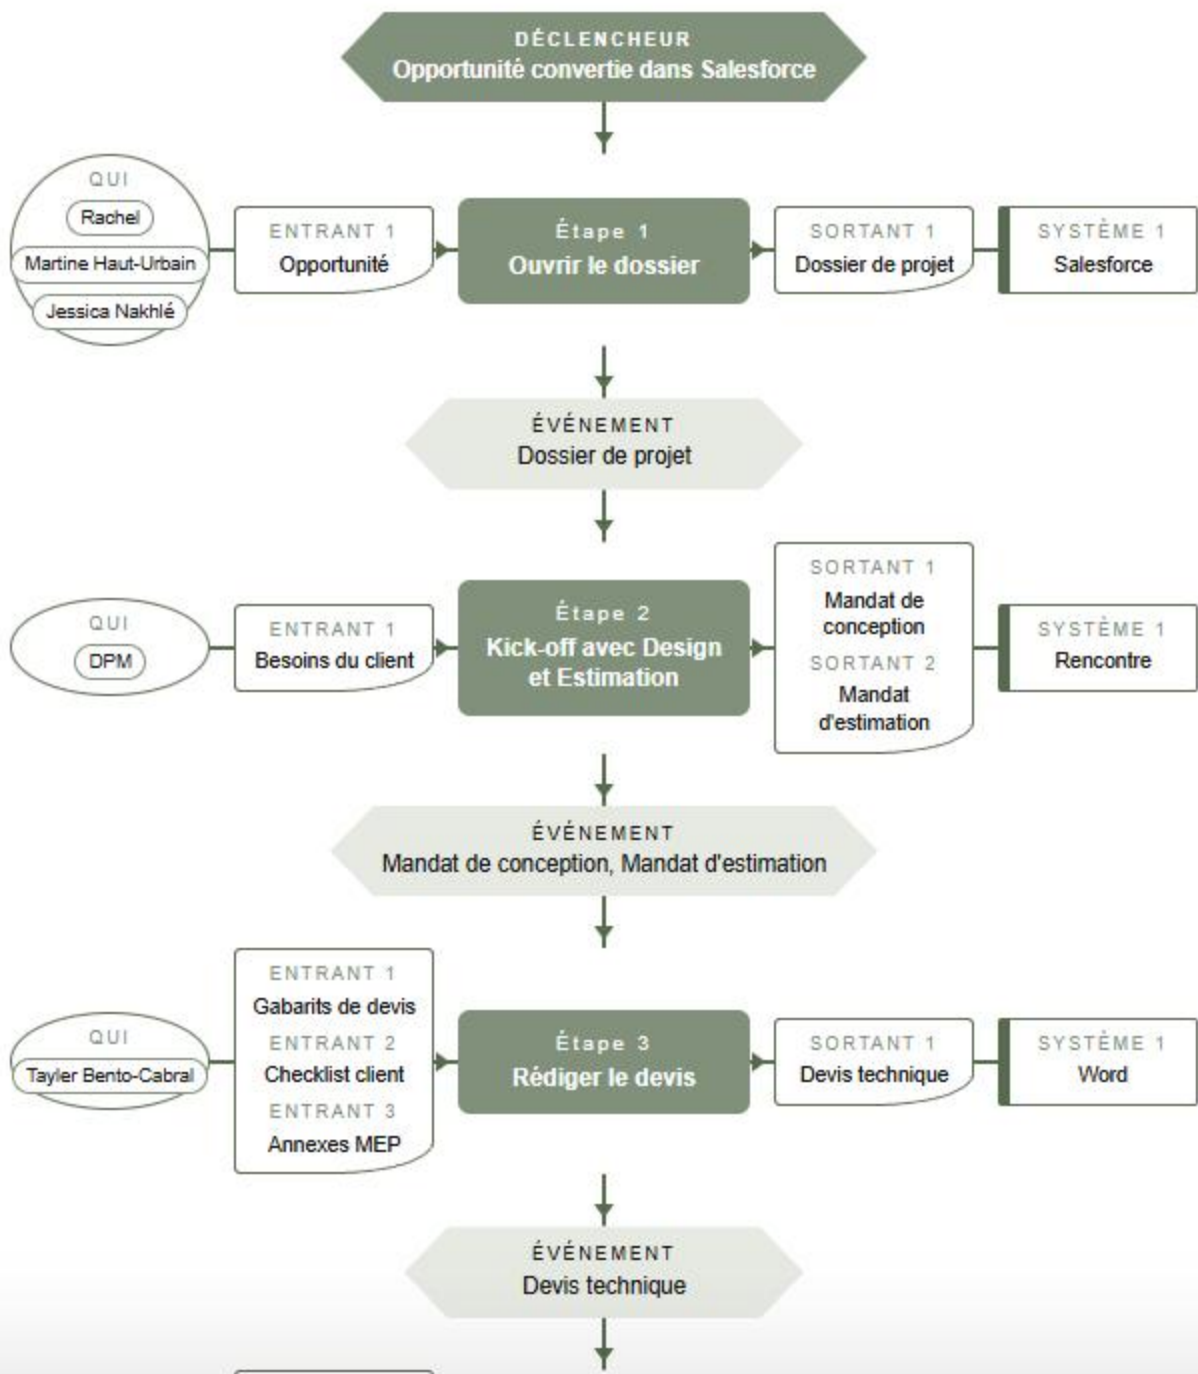

PROCESSUS

Les différentes étapes de ces processus ont été cartographiées par département, et les ressources humaines ainsi que les systèmes utilisés ont été identifiés.



Les étapes
CARTOGRAPHIÉES PAR DÉPARTEMENT



Les ressources humaines
IDENTIFIÉES



Les systèmes
UTILISÉS



Menu

Rapport des objectifs

Capacité des ressources

Projets d'amélioration continue

Gantt des mandats

Systèmes



CAPACITÉ DES RESSOURCES

Cartographie des employés

PLUS LA BULLE EST GRANDE, PLUS LA PERSONNE INTERVIENT DANS UN GRAND NOMBRE D'ÉTAPES DE PROCESSUS

TABLEAU DE BORD

VUE D'ENSEMBLE

41

personnes nommées dans au moins une étape

138

étapes de processus cartographiées

44

étapes attribuées à un rôle ou une équipe sans personne nommée

DÉPARTEMENTS

PSDT	3
Urbanisme	1
Location	4
Développement de projets	5
Design et Architecture	2
Estimation	2
Génie conseil et CQ	2
Construction	2
Approvisionnement	3
Investissement	5
Finance Construction	3
Finance Paie	2
Administration	2
Affaires publiques	2
Hors organigramme relevé	3

ÉCHELLE



CAPACITÉ DES RESSOURCES

Les processus ont permis d'identifier la charge de travail des ressources humaines, basée sur le nombre d'étapes où chaque personne est impliquée.



La charge de travail
PAR PERSONNE



Le nombre d'étapes
OÙ LA PERSONNE INTERVIENT



La taille des bulles
PROPORTIONNELLE À CETTE CHARGE



Menu

Rapport des objectifs

Capacité des ressources

Projets d'amélioration continue

Gantt des mandats

Systèmes



SYSTÈMES

Cartographie des systèmes

PLUS LA BULLE EST GRANDE, PLUS LE SYSTÈME EST UTILISÉ. CHAQUE LIGNE ENTRE DEUX SYSTÈMES REPRÉSENTE UNE DONNÉE ÉCHANGÉE.

TABLEAU DE BORD

VUE D'ENSEMBLE

34

systèmes cités dans les étapes de processus

88

paires de systèmes qui échangent des données

186

échanges de données au total

0

système sans échange avec les autres


SYSTÈMES LES PLUS UTILISÉS

Excel	37
Outlook	28
Word	14
Salesforce	12
Acumatica	9
DocuSign	8
Procore	8
PowerPoint	7

LECTURE

—	1 échange de données
≡	3 échanges de données

Un système compte une fois par étape où il est cité. Deux systèmes échangent une donnée lorsqu'ils servent dans la même étape ou dans deux étapes qui se suivent. Au-delà de 10 échanges, le faisceau reste à 10 lignes et l'infobulle donne le total.

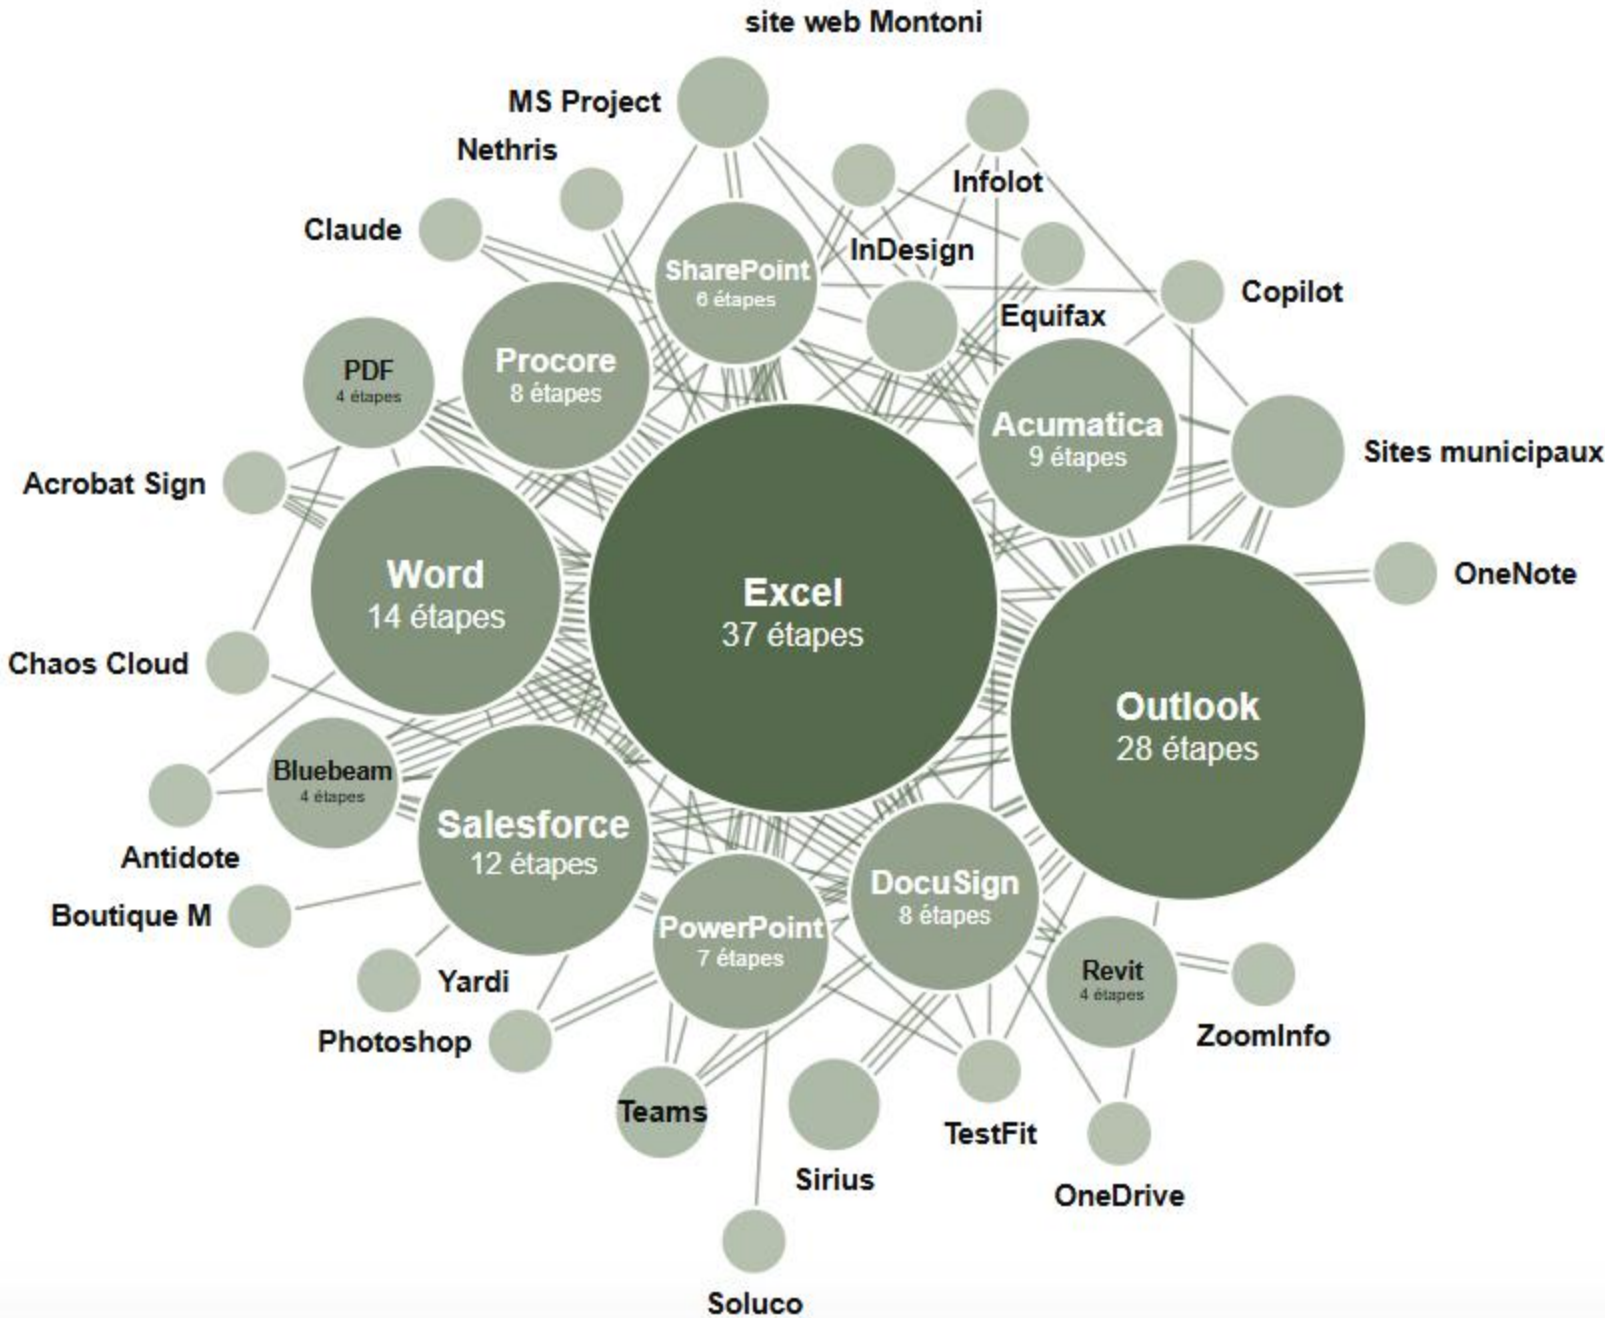

SYSTÈMES

Ces processus ont également permis d'identifier la liste des systèmes utilisés par l'entreprise. Plus la bulle est grande, plus le système est utilisé.



Les systèmes
UTILISÉS PAR L'ENTREPRISE



La taille des bulles
PROPORTIONNELLE À L'UTILISATION



Les lignes
DONNÉES ÉCHANGÉES ENTRE SYSTÈMES



OBJECTIF DU MANDAT

Accroître la performance opérationnelle et optimiser les coûts des systèmes

Le mandat vise l'efficacité globale de l'entreprise : optimiser les coûts opérationnels et les coûts des systèmes.



Efficacité globale
DE L'ENTREPRISE



Coûts opérationnels
À OPTIMISER



Coûts des systèmes
À OPTIMISER

La stratégie ?



×

TABLEAU DE BORD

Menu

Rapport des objectifs

1 G\$

d'actifs stabilisés hors Québec en trois ans

25 M pi²

de terrain développable disponible en permanence

14 à 16 %

de profitabilité sur les contrats de construction

1 M pi²

loués dans le portefeuille

Capacité des ressources

Projets d'amélioration continue

Gantt des mandats

Systèmes

RAPPORT DES OBJECTIFS

14 à 16 % de profitabilité sur les contrats de construction

ENTREVUE FINANCE CONSTRUCTION, 14 JUILLET 2026, ANTONINO BORSELLINO

TABLEAU DE BORD

14 à 16 %

de profitabilité sur les contrats de construction

FINANCE CONSTRUCTION

Profitabilité

La Finance Construction doit assurer le contrôle des coûts des projets pour que chaque contrat de construction atteigne la marge visée.

CIBLE

14 à 16

%

contrat

→

ÉCART

-4

point

contrat

→

RÉEL

10 à 12

%

contrat

→

Délai de paiement des sous-traitants

L'objectif est d'optimiser les délais de paiement des sous-traitants, car un paiement dans les délais conditionne les escomptes et la relation avec les fournisseurs.

CIBLE

21 à 25

jour

facture

→

ÉCART

+2 à +6

jour

facture

→

RÉEL

27

jour

facture

→

Escompte capté

L'objectif est de capter les escomptes offerts par les fournisseurs pour paiement rapide, ce qui améliore directement la marge des contrats.

CIBLE

0

%

contrat

→

aucune cible fixée

ÉCART

0

%

contrat

→

aucune cible fixée

RÉEL

1 à 2

%

contrat

→

Date de livraison du rapport mensuel

ESTIMATION

Écart entre budget déposé et réel

L'Estimation doit garantir la justesse des estimations, l'écart entre le budget déposé et le coût réel mesurant la fiabilité de la marge annoncée.

CIBLE

1 à 4

%

projet

→

ÉCART

0

%

projet

→

réel non documenté

RÉEL

0

%

projet

→

réel non documenté

Écart entre prix soumissionnés et prix octroyés

L'objectif est d'intégrer les prix réellement octroyés dans les bases de prix, pour que les soumissions reflètent le marché.

CIBLE

0

%

contrat

→

aucune cible fixée

ÉCART

0

%

contrat

→

aucune cible fixée

RÉEL

≈ 20

%

contrat

→

OBJECTIF 1

Identifier les objectifs et indicateurs de performance globaux de l'entreprise.

Les objectifs globaux DE L'ENTREPRISE

Les indicateurs de performance QUI LES MESURENT

Cible, réel et écart PAR DÉPARTEMENT

→

Menu

Rapport des objectifs

1 G\$

d'actifs stabilisés hors Québec en trois ans

25 M pi²

de terrain développable disponible en permanence

14 à 16 %

de profitabilité sur les contrats de construction

1 M pi²

loués dans le portefeuille

Capacité des ressources

Projets d'amélioration continue

Gantt des mandats

Systèmes

14 à 16 % de profitabilité sur les contrats de construction

ENTREVUE FINANCE CONSTRUCTION, 14 JUILLET 2026, ANTONINO BORSELLINO

5 à 10

jour

mois



+5 à +10

jour

mois



15

jour

mois



DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Heures par itération



Le Développement de projets doit réduire les reprises liées aux itérations client, chaque itération consommant des heures non facturées.

CIBLE

50 à 60

heure

itération



ÉCART

+40 à +50

heure

itération



RÉEL

100

heure

itération



Précision d'estimation



L'objectif est de transférer à l'exécution des projets dont le budget est fiable, pour respecter la marge et l'échéancier engagés auprès du client.

CIBLE

1 à 4

%

projet



ÉCART

0

%

projet



réel non documenté

RÉEL

0

%

projet



réel non documenté

APPROVISIONNEMENT

Réussite de la preuve de livraison



L'Approvisionnement doit facturer l'intégralité des livraisons et des locations aux projets, ce qui exige une preuve de livraison pour chaque commande.

CIBLE

0

%

livraison



aucune cible fixée

ÉCART

0

%

livraison



aucune cible fixée

RÉEL

50

%

livraison



Identifier les objectifs départementaux reliés à ces objectifs globaux.



Les objectifs départementaux
PAR DÉPARTEMENT



Le lien avec l'objectif global
QU'ILS SERVENT



Cible, écart et réel
POUR CHAQUE INDICATEUR



×

DÉPARTEMENT

Développement de projets

OBJECTIFS

1 Convertir les opportunités en contrats signés ▶

2 Transférer à l'exécution des projets complets, avec contrat, budget, portée et échéancier arrêtés ▶

3 Respecter la marge et l'échéancier engagés auprès du client ▶


4 Réduire les reprises liées aux itérations client ▼

Heures par itération

RESSOURCES HUMAINES ▶

PROCESSUS ▶

DIAGNOSTICS ▶

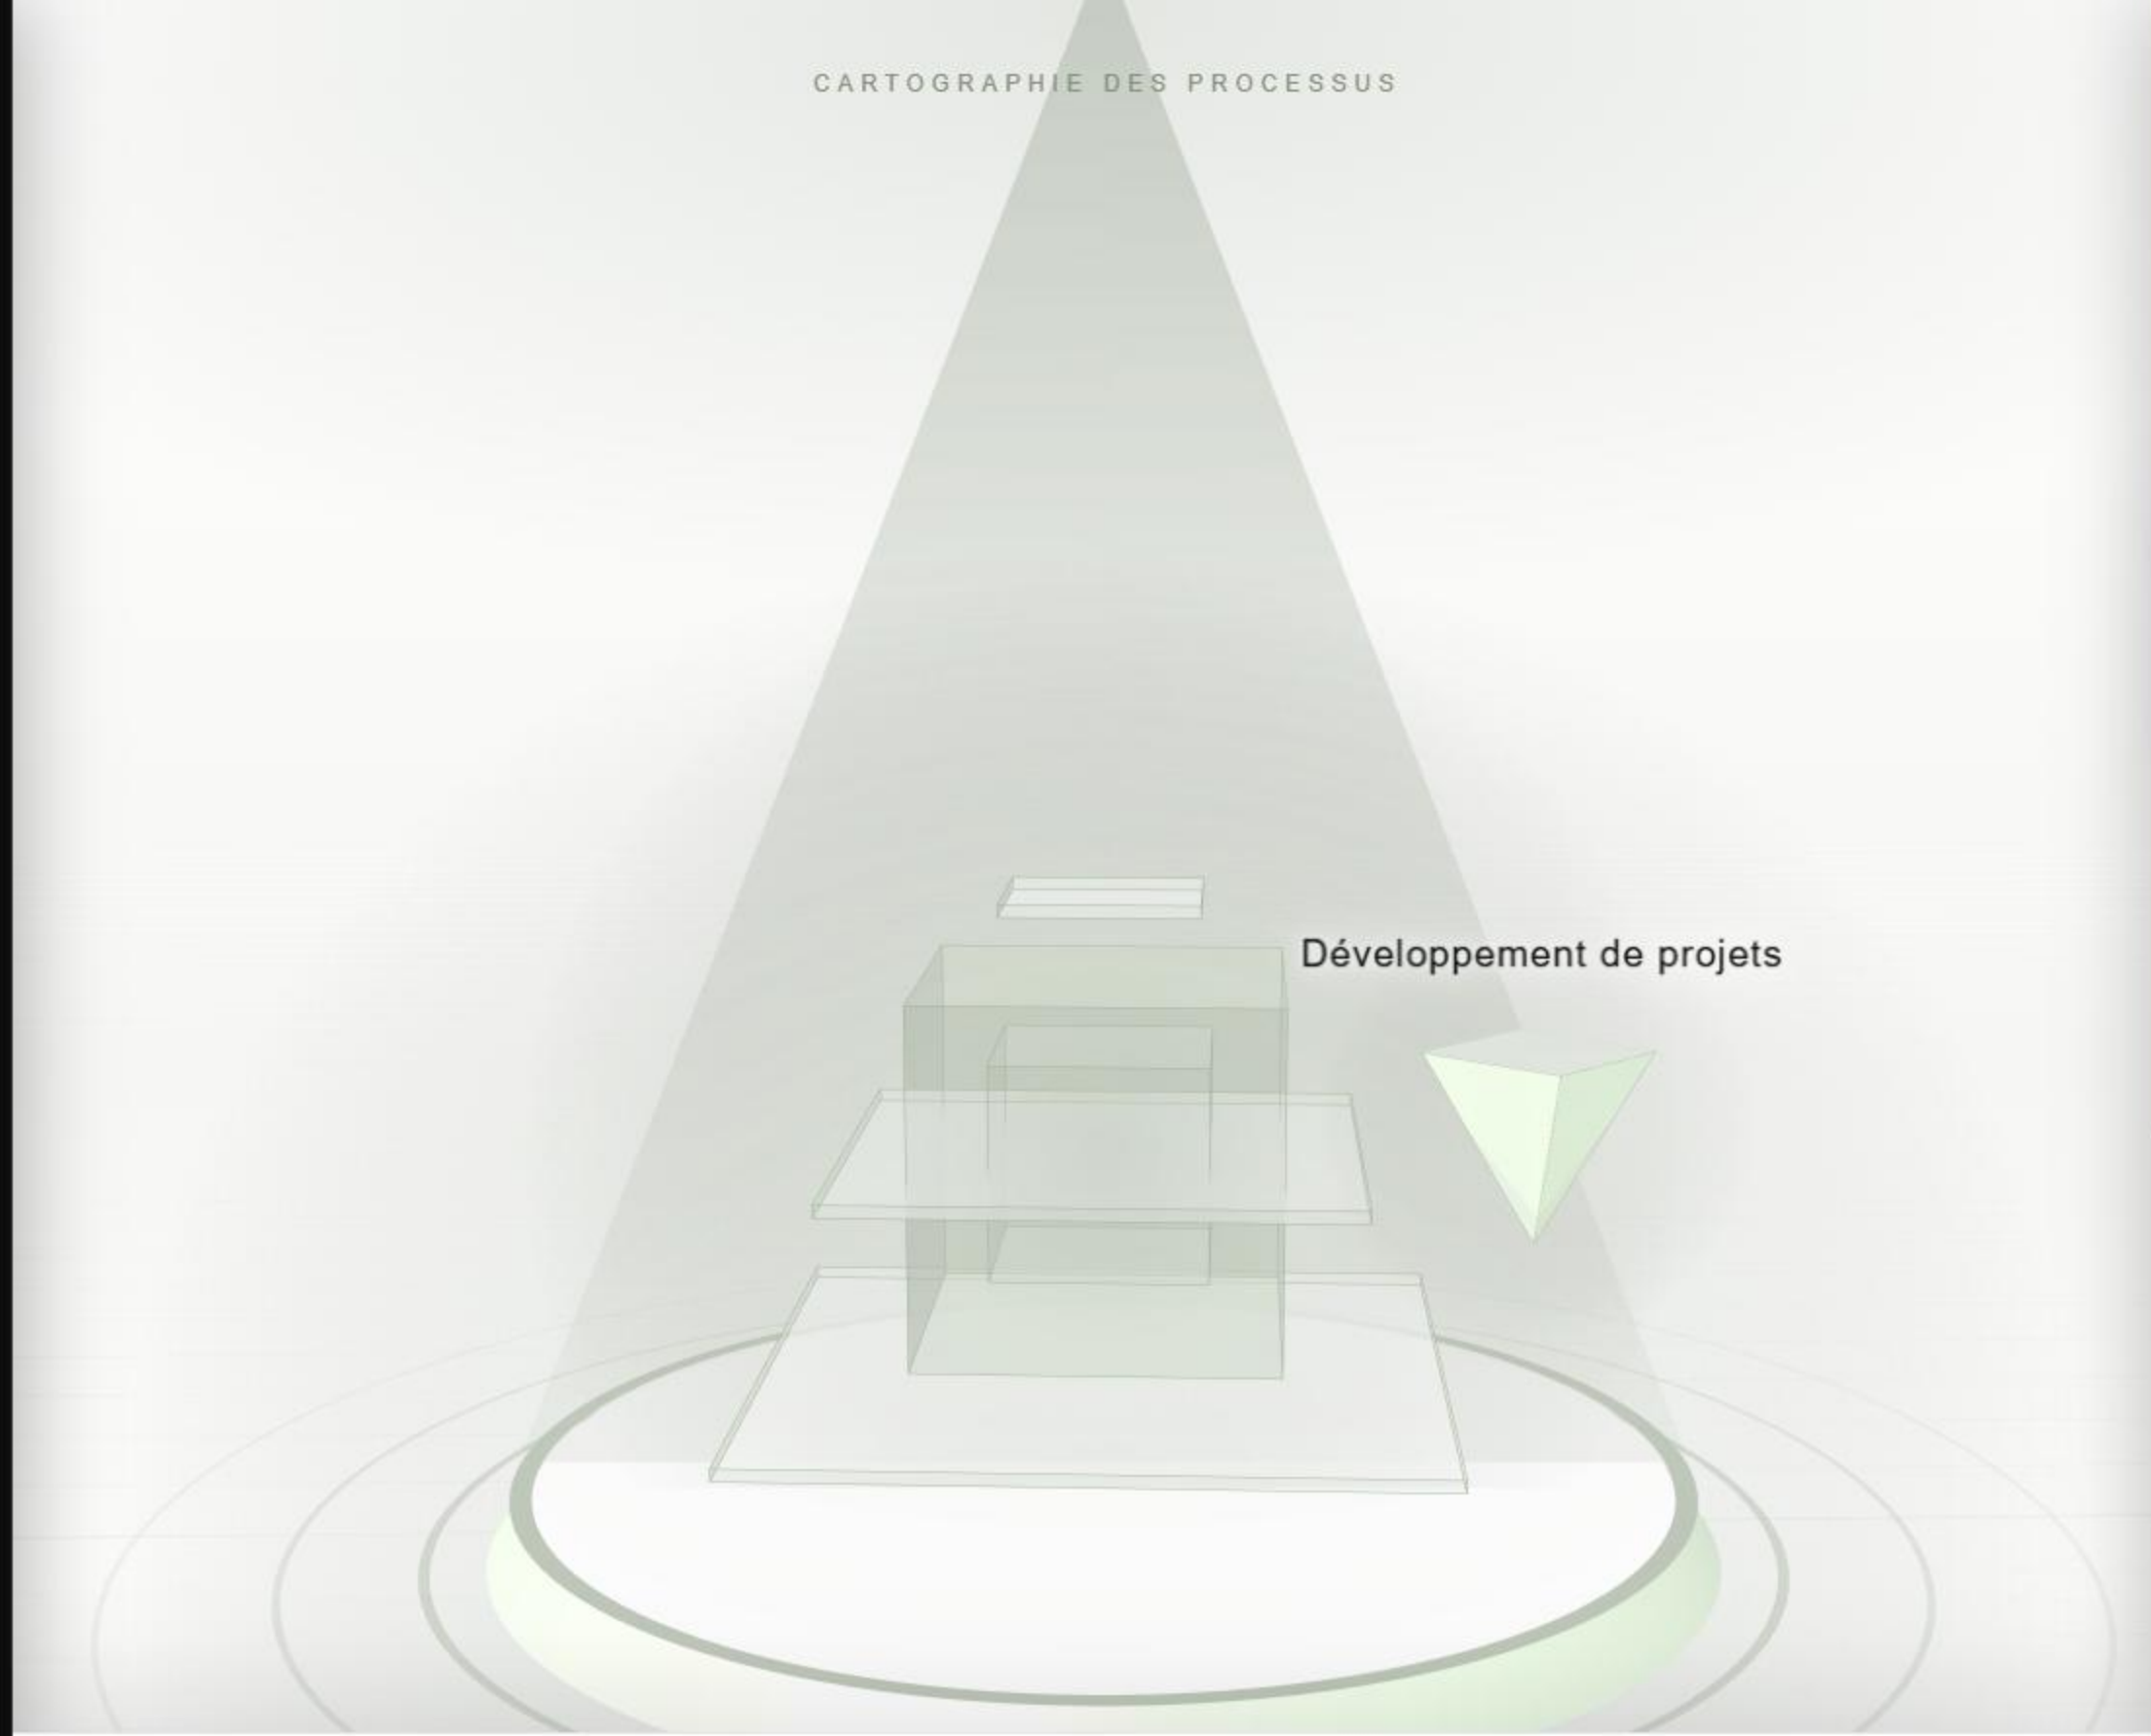

TABEAU DE BORD

INDICATEUR CIBLE

Heures par itération

50 à 60 heures par itération

→

DONNÉE RÉELLE

100 heures par itération

→

OBJECTIF 3

×

Confirmer la donnée cible attendue pour chaque objectif.

🎯

La cible attendue
POUR CHAQUE INDICATEUR

👤

À confirmer
AVEC CHAQUE DÉPARTEMENT

📊

La donnée réelle
POUR MESURER L'ÉCART

→

DÉPARTEMENT

Développement de projets

OBJECTIFS

1 Convertir les opportunités en contrats signés ▶

2 Transférer à l'exécution des projets complets, avec contrat, budget, portée et échéancier arrêtés ▶

3 Respecter la marge et l'échéancier engagés auprès du client ▶

4 Réduire les reprises liées aux itérations client ▼

Heures par itération

RESSOURCES HUMAINES ▶

PROCESSUS ▶

DIAGNOSTICS ▶

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS

Développement de projets

TABLEAU DE BORD

INDICATEUR CIBLE

Heures par itération

50 à 60 heures
par itération



DONNÉE RÉELLE

100 heures par
itération



OBJECTIF 4

Recueillir des données réelles sur les opérations actuelles.



La donnée réelle
OBSERVÉE AUJOURD'HUI



Recueillie sur le terrain
DANS LES OPÉRATIONS



Comparée à la cible
POUR MESURER L'ÉCART



Comment recueillir les données réelles efficacement ?



DÉPARTEMENT

Développement de projets

OBJECTIFS

RESSOURCES HUMAINES

PROCESSUS

Préconstruction d'un projet

11 étapes

Réponse à un appel d'offres client

3 étapes


DIAGNOSTICS

PROCESSUS

Préconstruction d'un projet

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Événement Étape Qui exécute Document entrant, document sortant Système

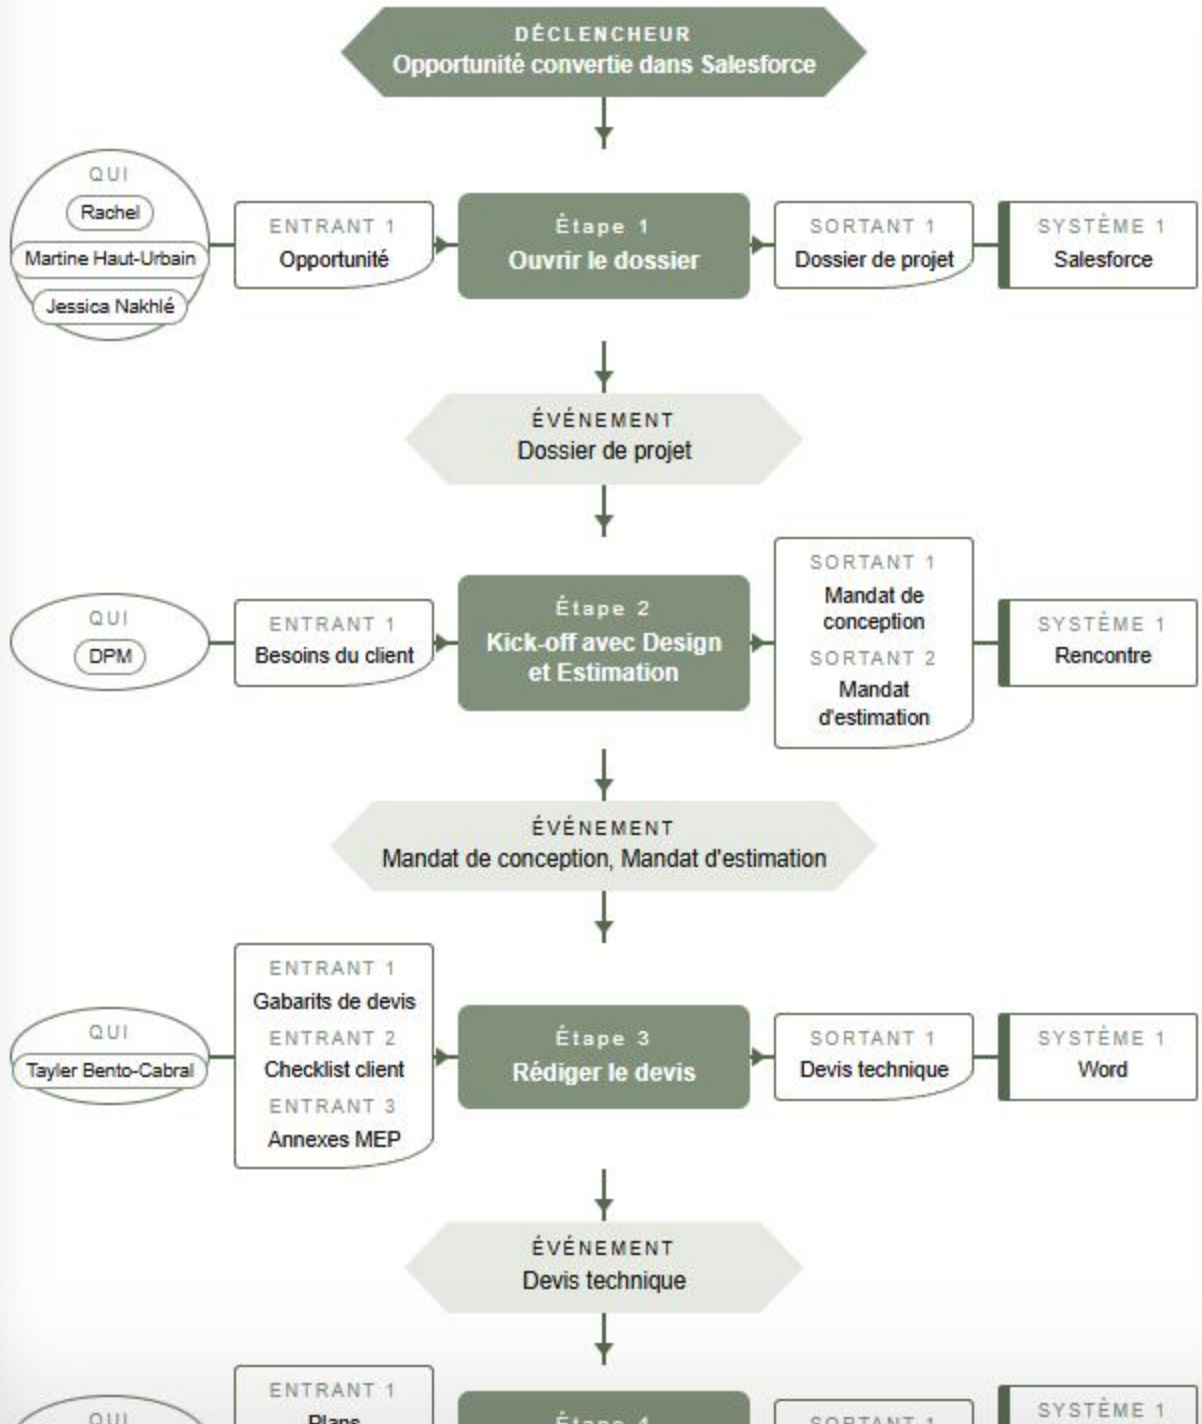

ÉTAPE 7

Envoyer la proposition

TEMPS	Temps de traitement actif	=	▼	0	unité	période
	Temps d'attente avant l'étape	=	▼	0	unité	période
	Temps d'attente après l'étape	=	▼	0	unité	période
	Temps de cycle global	=	▼	0	unité	période
VOLUME	Entrant 1 - Lettre	=	▼	0	unité	période
	Entrant 2 - Devis	=	▼	0	unité	période
	Entrant 3 - Plans	=	▼	0	unité	période
	Entrant 4 - Budget	=	▼	0	unité	période
	Entrant 5 - Échéancier	=	▼	0	unité	période
	Sortant 1 - Proposition client	≈	▼	200	proposition	an
	Encours / WIP	=	▼	0	unité	période
CAPACITÉ	Capacité maximale de l'étape	=	▼	0	unité	période
QUALITÉ	% entrants complets	=	▼	0	unité	période
	% extrants conformes du pre...	=	▼	0	unité	période
RESSOURCES	Rôle responsable			DPM		
SYSTÈMES	Système 1 - Salesforce	=	▼	0	%	

COLLECTE DES DONNÉES RÉELLES

Les processus étant déjà cartographiés, nous évaluerons avec les exécutants, pour chaque étape :



Les temps de cycle

TRAITEMENT ET ATTENTES



Les volumes gérés

INTRANTS ET EXTRANTS



L'automatisation

% PAR SYSTÈME



Les dépendances

ENTRE DÉPARTEMENTS



×

DÉPARTEMENT

Développement de projets

OBJECTIFS

RESSOURCES HUMAINES

PROCESSUS

Préconstruction d'un projet
11 étapes

Réponse à un appel d'offres client
3 étapes

DIAGNOSTICS

PROCESSUS

Préconstruction d'un projet

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Événement

Étape

Qui exécute

Document entrant, document sortant

Système

DÉCLENCHEUR

Opportunité convertie dans Salesforce

QUI

Rachel

Martine Haut-Urbain

Jessica Nakhlé

ENTRANT 1

Opportunité

Étape 1

Ouvrir le dossier

SORTANT 1

Dossier de projet

SYSTÈME 1

Salesforce

ÉVÉNEMENT

Dossier de projet

QUI

DPM

ENTRANT 1

Besoins du client

Étape 2

Kick-off avec Design et Estimation

SORTANT 1

Mandat de conception

SORTANT 2

Mandat d'estimation

SYSTÈME 1

Rencontre

ÉVÉNEMENT

Mandat de conception, Mandat d'estimation

QUI

Tayler Bento-Cabral

ENTRANT 1

Gabarits de devis

ENTRANT 2

Checklist client

ENTRANT 3

Annexes MEP

Étape 3

Rédiger le devis

SORTANT 1

Devis technique

SYSTÈME 1

Word

ÉVÉNEMENT

Devis technique

QUI

ENTRANT 1

Diane

Étape 4

SORTANT 1

SYSTÈME 1

GOULOTS D'ÉTRANGLEMENT

Cliquer une étiquette pour voir la cause et les analyses

1.1 Aucune base historique exploitable

1.2 Production manuelle des devis

1.3 Annexes mécaniques et électriques

1.4 Estimation non intégrée au BIM

1.5 Rework des itérations client

1.6 Échéanciers MS Project entièrement manuels

1.9 Personnes-pivots uniques

1.10 Silos estimé, échéancier, cash-flow

1.11 Équipe légale débordée

1.12 Villes et organismes publics

1.13 Attente des sous-traitants

1.14 Handoffs internes déficients

1.15 Écosystème fragmenté selon le chapeau

TEMPS DE CYCLE ET DÉLAIS

Par étape, tels que documentés en entrevue

ÉTAPE 1

Ouvrir le dossier

TEMPS	Temps de traitement actif	=	▼	0	unité	période
	Temps d'attente avant l'étape	=	▼	0	unité	période
	Temps d'attente après l'étape	=	▼	0	unité	période
	Temps de cycle global	=	▼	0	unité	période
VOLUME	Entrant 1 - Opportunité	≈	▼	200	proposition	an
	Sortant 1 - Dossier de projet	=	▼	0	unité	période
	Encours / WIP	=	▼	0	unité	période
CAPACITÉ	Capacité maximale de l'étape	=	▼	0	unité	période

GOULOTS D'ÉTRANGLEMENT

Les données recueillies permettront d'identifier les différents goulots d'étranglement de chaque processus.

Identifiés par les données
TEMPS, VOLUMES ET ÉCARTS

Un goulot
PAR POINT DE BLOCAGE OBSERVÉ

Rattachés aux étapes
DU PROCESSUS

→

×

DÉPARTEMENT

Développement de projets

OBJECTIFS

RESSOURCES HUMAINES

PROCESSUS

Préconstruction d'un projet
11 étapes

Réponse à un appel d'offres client
3 étapes

DIAGNOSTICS

PROCESSUS

Préconstruction d'un projet

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Événement

Étape

Qui exécute

Document entrant, document sortant

Système

GOULOTS D'ÉTRANGLEMENT

Cliquer une étiquette pour voir la cause et les analyses

1.1 Aucune base historique exploitable

1.2 Production manuelle des devis

1.3 Annexes mécaniques et électriques

BIM

1.5 Rework des itérations client

1.6 Échéanciers MS Project entièrement manuels

1.10 Silos estimé, échéancier, cash-flow

1.11 Équipe légale débordée

1.13 Attente des sous-traitants

1.14 Handoffs internes déficients

selon le chapeau

GOULOT D'ÉTRANGLEMENT

Aucune base historique exploitable

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Diagnostic 1 - Introduction au département - 23 avril 2026

RÉSUMÉ DE LA CAUSE

Chaque estimé et chaque échéancier repart de zéro parce que trente ans de projets n'ont jamais été structurés dans une base consultable, avec une nomenclature commune.

« À chaque fois qu'il y a un nouveau job, c'est comme il y a l'amnésie... c'est terrible »

Analyse des Pourquoi

Diagramme d'Ishikawa

Entrant 1

Opportunité

QUI

Rachel

Martine Haut-Urbain

Jessica Nakhlé

Entrant 1

Besoins du client

QUI

DPM

Mand

Entrant 1

Gabarits de devis

Entrant 2

Checklist client

Entrant 3

Annexes MEP

QUI

Tayler Bento-Cabral

Étape 3

Rédiger le devis

Sortant 1

Devis technique

Système 1

Word

Événement

Devis technique

Temps de traitement actif

=

▼

0

unité

période

Temps d'attente avant l'étape

=

▼

0

unité

période

Temps d'attente après l'étape

=

▼

0

unité

période

Temps de cycle global

=

▼

0

unité

période

VOLUME

Entrant 1 - Opportunité

≈

▼

200

proposition

an

Sortant 1 - Dossier de projet

=

▼

0

unité

période

Encours / WIP

=

▼

0

unité

période

ANALYSE DES GOULOTS

×

Basé sur les bonnes pratiques du génie industriel, chaque goulot d'étranglement aura une analyse des cinq pourquoi et un diagramme d'Ishikawa, qui relie les causes à l'origine du goulot.

Les cinq pourquoi

JUSQU'À LA CAUSE RACINE



Le diagramme d'Ishikawa

LES CAUSES PAR FAMILLE

Pour chaque goulot

BONNES PRATIQUES DU GÉNIE INDUSTRIEL


→

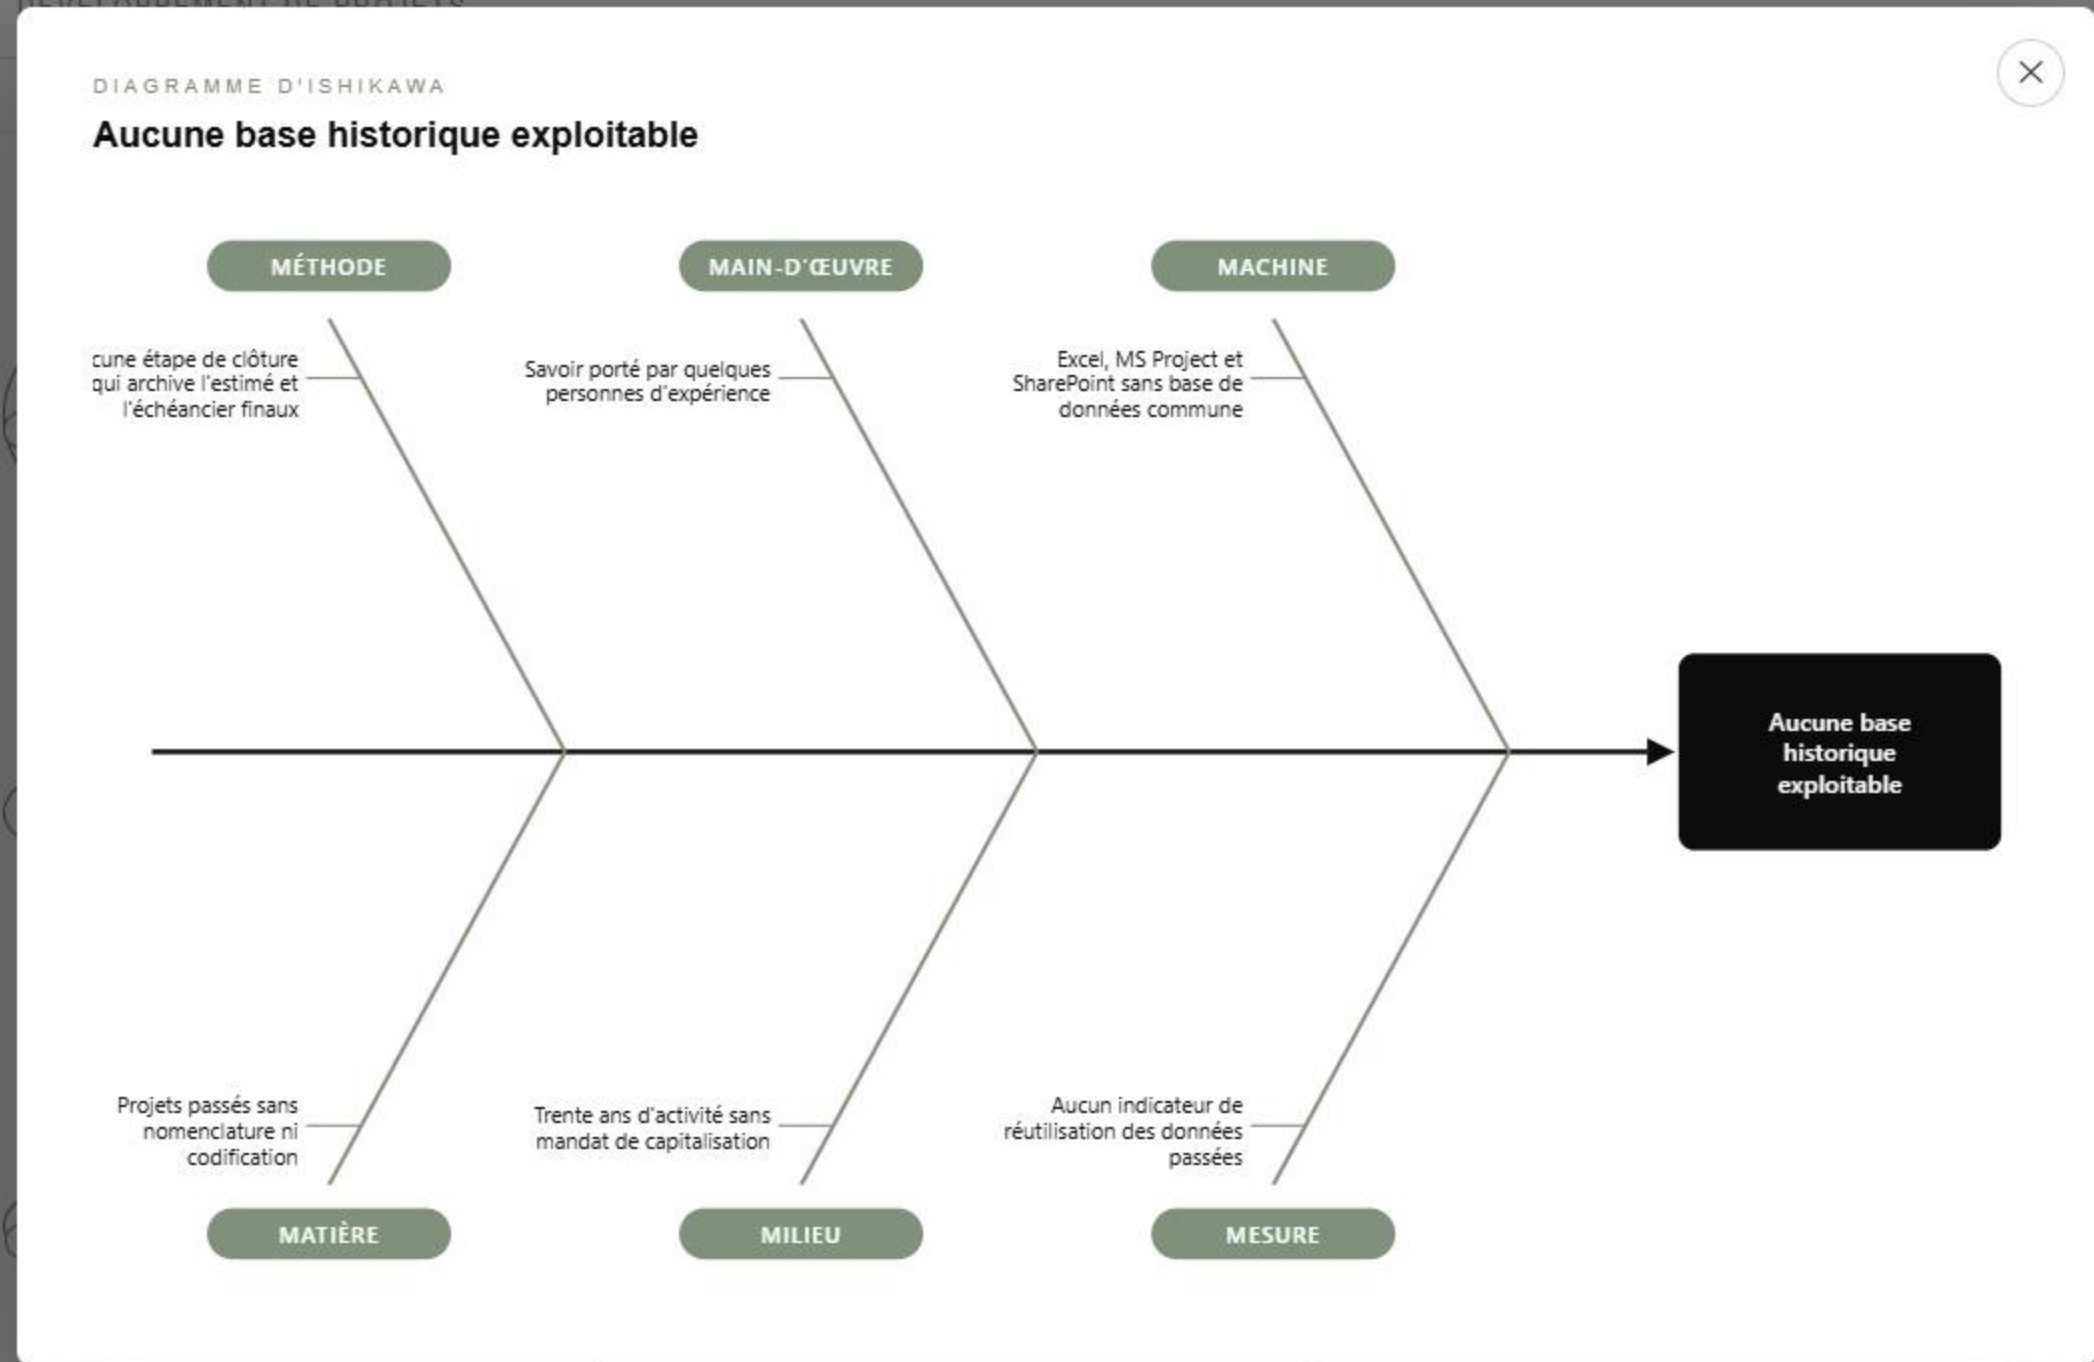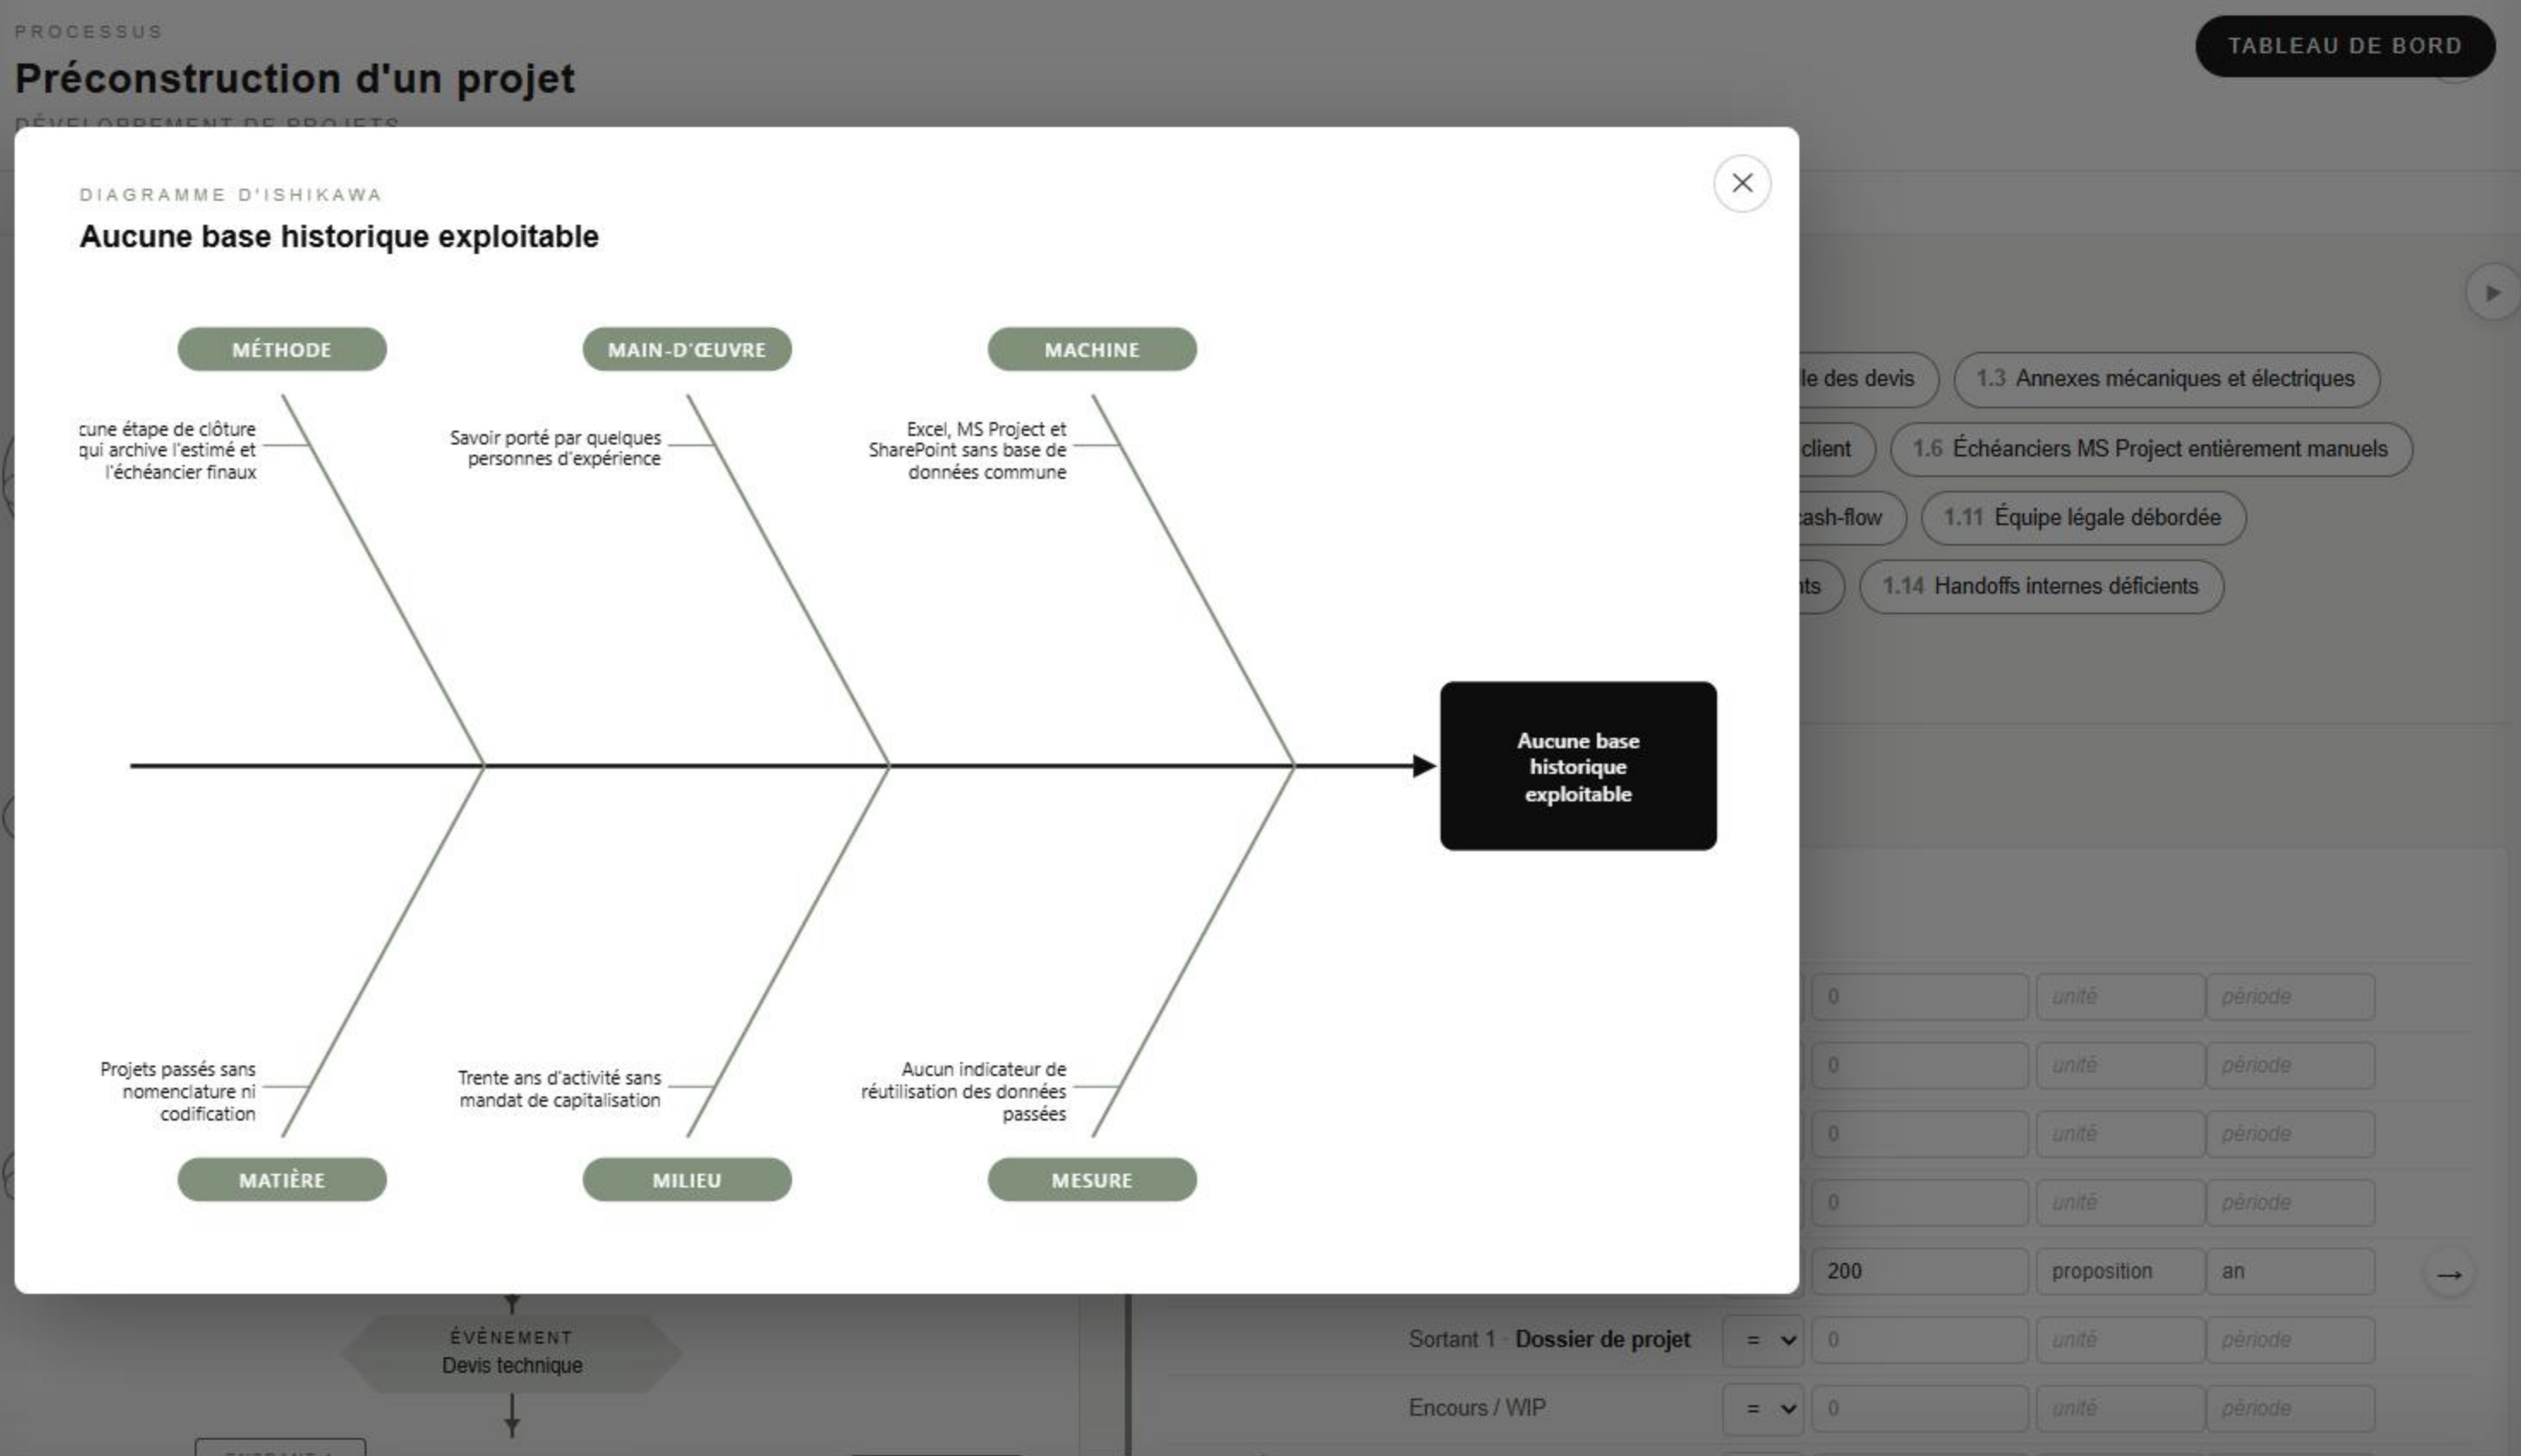

Préconstruction d'un projet

ANALYSE DES CINQ POURQUOI

Aucune base historique exploitable

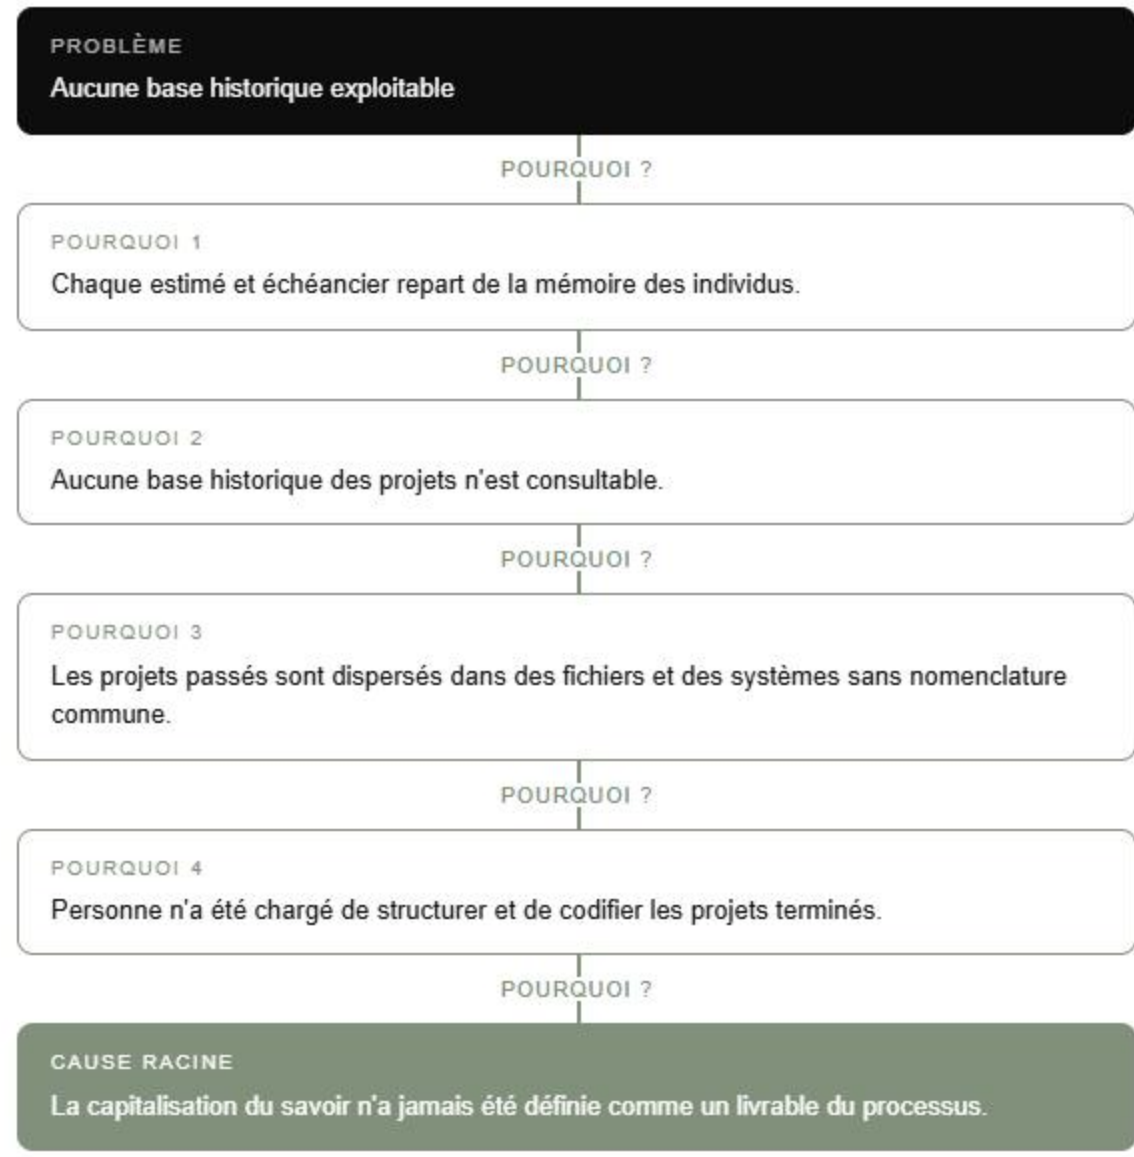

ANALYSE DES CINQ POURQUOI

L'analyse des cinq pourquoi remonte de cause en cause, du problème observé jusqu'à la cause racine du goulot.

- 🔍

Le problème
TEL QU'OBSERVÉ
- 🔍

Cinq pourquoi successifs
CHAQUE RÉPONSE EST QUESTIONNÉE
- 🎯

La cause racine
À TRAITER EN PRIORITÉ



Menu

Rapport des objectifs

Capacité des ressources

Projets d'amélioration continue

Gantt des mandats

Systèmes



PROJETS D'AMÉLIORATION CONTINUE

Kanban des pistes

CHAQUE GOULOT D'ÉTRANGLEMENT EST CLASSÉ DANS UNE OU DEUX CATÉGORIES DE PISTE. GLISSER UNE CARTE POUR LA RECLASSER, CLIQUER POUR GÉRER LE PROJET.

DÉPARTEMENT

Tous les départements

PROJET

Tous

146 goulots - 0 projet d'amélioration

ÉLIMINATION DES
ACTIVITÉS À VALEUR NON
AJOUTÉE

13

PSDT

6.7 Répondre sans cesse aux
mêmes questions

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

URBANISME

5.5 Rapports argumentaires
refaits dans InDesign

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

LOCATION

9.6 Brochures téléchargées une à
une

aussi : Automatisation

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.5 Rework des itérations client

aussi : Intégration de systèmes

DESIGN ET ARCHITECTURE

7.7 Duplication avec l'Urbanisme

aussi : Clarification des responsabilités

ESTIMATION

3.3 Ventilation des coûts par
bâtiment et usage

aussi : Automatisation

SIMPLIFICATION DE
PROCESSUS

22

PSDT

6.9 Dépendance à la chaîne
design, estimé, pro forma

aussi : Gestion de la capacité

PSDT

6.3 Deal sheet parfois sauté,
risque accru

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

PSDT

6.13 Dossiers abandonnés laissés
sans sommaire

aussi : Clarification des responsabilités

URBANISME

5.8 Workflow inversé avec le
Design

aussi : Clarification des responsabilités

LOCATION

9.9 Négociations en cascade

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.13 Attente des sous-traitants

aussi : Automatisation

DESIGN ET ARCHITECTURE

7.8 Boucle d'estimation lente

STANDARDISATION DES
NOMENCLATURES ET
GABARITS

39

PSDT

6.6 Savoir enfermé dans les têtes

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

PSDT

6.3 Deal sheet parfois sauté,
risque accru

aussi : Simplification de processus

PSDT

6.4 Outil de pré-qualification
abandonné

aussi : Automatisation

PSDT

6.12 Transfert au Développement
sans document

aussi : Clarification des responsabilités

URBANISME

5.2 Risque d'erreur aux
conséquences de plusieurs mois

aussi : Automatisation

URBANISME

5.5 Rapports argumentaires
refaits dans InDesign

aussi : Élimination des activités à valeur
non ajoutée

CLARIFICATION DES
RESPONSABILITÉS

28

PSDT

6.10 Dépendance au légal

aussi : Gestion de la capacité

PSDT

6.12 Transfert au Développement
sans document

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

PSDT

6.13 Dossiers abandonnés laissés
sans sommaire

aussi : Simplification de processus

URBANISME

5.8 Workflow inversé avec le
Design

aussi : Simplification de processus

LOCATION

9.7 Approbation à goulot unique

aussi : Gestion de la capacité

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.11 Équipe légale débordée

aussi : Gestion de la capacité

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.14 Handoffs internes déficients

GESTION DE LA CAPACITÉ

17

PSDT

6.9 Dépendance à la chaîne
design, estimé, pro forma

aussi : Simplification de processus

PSDT

6.10 Dépendance au légal

aussi : Clarification des responsabilités

PSDT

6.11 Délais du landev hors de
contrôle

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

URBANISME

5.3 Capacité insuffisante en
phase préliminaire

LOCATION

9.7 Approbation à goulot unique

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.11 Équipe légale débordée

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.9 Personnes-pivots uniques

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

AMÉLIORATION DE LA
DISPONIBILITÉ DES
DONNÉES

PSDT

6.6 Savoir enfermé dans

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

PSDT

6.7 Répondre sans cesse
aux mêmes questions

aussi : Élimination des activités à valeur
non ajoutée

PSDT

6.8 Recherche de données
publiques

aussi : Intégration de systèmes

PSDT

6.11 Délais du landev hors de
contrôle

aussi : Gestion de la capacité

URBANISME

5.7 Réglementation mu-
lti-hétérogène

aussi : Intégration d'intelligence

URBANISME

5.9 Information existante
inaccessible

aussi : Intégration de systèmes

PROJETS D'AMÉLIORATION CONTINUE

En fonction des causes identifiées pour chaque goulot d'étranglement, nous pourrions classer sa piste d'amélioration. Voici les différentes catégories :



Chaque goulot

CLASSÉ SELON SES CAUSES



Neuf catégories de piste

UNE OU DEUX PAR GOULOT



Un projet par piste

À PLANIFIER ET SUIVRE



Menu

Rapport des objectifs

Capacité des ressources

Projets d'amélioration continue

Gantt des mandats

Systèmes

Kanban des pistes

CHAQUE GOULOT D'ÉTRANGLEMENT EST CLASSÉ DANS UNE OU DEUX CATÉGORIES DE PISTE. GLISSER UNE CARTE POUR LA RECLASSER, CLIQUER POUR GÉRER LE PROJET.

DÉPARTEMENT

Tous les départements

PROJET

Tous

146 goulots - 0 projet d'amélioration

ÉLIMINATION DES
ACTIVITÉS À VALEUR NON
AJOUTÉE

13

PSDT

6.7 Répondre sans cesse aux
mêmes questions

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

URBANISME

5.5 Rapports argumentaires
refaits dans InDesign

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

LOCATION

9.6 Brochures téléchargées une à
une

aussi : Automatisation

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.5 Rework des itérations client

aussi : Intégration de systèmes

DESIGN ET ARCHITECTURE

7.7 Duplication avec l'Urbanisme

aussi : Clarification des responsabilités

ESTIMATION

3.3 Ventilation des coûts par
bâtiment et usage

aussi : Automatisation

SIMPLIFICATION DE
PROCESSUS

22

PSDT

6.9 Dépendance à la chaîne
design, estimé, pro forma

aussi : Gestion de la capacité

PSDT

6.3 Deal sheet parfois sauté,
risque accru

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

PSDT

6.13 Dossiers abandonnés laissés
sans sommaire

aussi : Clarification des responsabilités

URBANISME

5.8 Workflow inversé avec le
Design

aussi : Clarification des responsabilités

LOCATION

9.9 Négociations en cascade

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.13 Attente des sous-traitants

aussi : Automatisation

DESIGN ET ARCHITECTURE

7.8 Boucle d'estimation lente

aussi : Intégration de systèmes

STANDARDISATION DES
NOMENCLATURES ET
GABARITS

39

PSDT

6.6 Savoir enfermé dans les têtes

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

PSDT

6.3 Deal sheet parfois sauté,
risque accru

aussi : Simplification de processus

PSDT

6.4 Outil de pré-qualification
abandonné

aussi : Automatisation

PSDT

6.12 Transfert au Développement
sans document

aussi : Clarification des responsabilités

URBANISME

5.2 Risque d'erreur aux
conséquences de plusieurs mois

aussi : Automatisation

URBANISME

5.5 Rapports argumentaires
refaits dans InDesign

aussi : Élimination des activités à valeur
non ajoutée

CLARIFICATION DES
RESPONSABILITÉS

28

PSDT

6.10 Dépendance au légal

aussi : Gestion de la capacité

PSDT

6.12 Transfert au Développement
sans document

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

PSDT

6.13 Dossiers abandonnés laissés
sans sommaire

aussi : Simplification de processus

URBANISME

5.8 Workflow inversé avec le
Design

aussi : Simplification de processus

LOCATION

9.7 Approbation à goulot unique

aussi : Gestion de la capacité

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.11 Équipe légale débordée

aussi : Gestion de la capacité

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.14 Handoffs internes déficients

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

GESTION DE LA CAPACITÉ

17

PSDT

6.9 Dépendance à la chaîne
design, estimé, pro forma

aussi : Simplification de processus

PSDT

6.10 Dépendance au légal

aussi : Clarification des responsabilités

PSDT

6.11 Délais du landev hors de
contrôle

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

URBANISME

5.3 Capacité insuffisante en
phase préliminaire

LOCATION

9.7 Approbation à goulot unique

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.11 Équipe légale débordée

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.9 Personnes-pivots uniques

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

AMÉLIORATION DE LA
DISPONIBILITÉ DES
DONNÉES

PSDT

6.6 Savoir enfermé dan

aussi : Standardisation des n
et gabarits

PSDT

6.7 Répondre sans ces
mêmes questions

aussi : Élimination des activit
non ajoutée

PSDT

6.8 Recherche de terrai
données publiques dis

aussi : Intégration de systèm

PSDT

6.11 Délais du landev h
contrôle

aussi : Gestion de la capacité

URBANISME

5.7 Réglementation mu
hétérogène

aussi : Intégration d'intelligen

URBANISME

5.9 Information existan
inaccessible

aussi : Intégration de systèm

CATÉGORIE 1 DE 9

Élimination des activités à valeur non ajoutée : retirer les tâches qui n'apportent rien au client ni au processus.



Élimination des activités à valeur non ajoutée
CATÉGORIE DE PISTE



Menu

Rapport des objectifs

Capacité des ressources

Projets d'amélioration continue

Gantt des mandats

Systèmes

Kanban des pistes

CHACQUE GOULOT D'ÉTRANGLEMENT EST CLASSÉ DANS UNE OU DEUX CATÉGORIES DE PISTE. GLISSER UNE CARTE POUR LA RECLASSER, CLIQUER POUR GÉRER LE PROJET.

DÉPARTEMENT

Tous les départements

PROJET

Tous

146 goulots - 0 projet d'amélioration

SIMPLIFICATION DE
PROCESSUS

22

PSDT

6.9 Dépendance à la chaîne
design, estimé, pro forma

aussi : Gestion de la capacité

PSDT

6.3 Deal sheet parfois sauté,
risque accru

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

PSDT

6.13 Dossiers abandonnés laissés
sans sommaire

aussi : Clarification des responsabilités

URBANISME

5.8 Workflow inversé avec le
Design

aussi : Clarification des responsabilités

LOCATION

9.9 Négociations en cascade

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.13 Attente des sous-traitants

aussi : Automatisation

DESIGN ET ARCHITECTURE

7.8 Boucle d'estimation lente

aussi : Intégration de systèmes

STANDARDISATION DES
NOMENCLATURES ET
GABARITS

39

PSDT

6.6 Savoir enfermé dans les têtes

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

PSDT

6.3 Deal sheet parfois sauté,
risque accru

aussi : Simplification de processus

PSDT

6.4 Outil de pré-qualification
abandonné

aussi : Automatisation

PSDT

6.12 Transfert au Développement
sans document

aussi : Clarification des responsabilités

URBANISME

5.2 Risque d'erreur aux
conséquences de plusieurs mois

aussi : Automatisation

URBANISME

5.5 Rapports argumentaires
refaits dans InDesign

aussi : Élimination des activités à valeur
non ajoutée

CLARIFICATION DES
RESPONSABILITÉS

28

PSDT

6.10 Dépendance au légal

aussi : Gestion de la capacité

PSDT

6.12 Transfert au Développement
sans document

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

PSDT

6.13 Dossiers abandonnés laissés
sans sommaire

aussi : Simplification de processus

URBANISME

5.8 Workflow inversé avec le
Design

aussi : Simplification de processus

LOCATION

9.7 Approbation à goulot unique

aussi : Gestion de la capacité

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.11 Équipe légale débordée

aussi : Gestion de la capacité

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.14 Handoffs internes déficients

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

GESTION DE LA CAPACITÉ

17

PSDT

6.9 Dépendance à la chaîne
design, estimé, pro forma

aussi : Simplification de processus

PSDT

6.10 Dépendance au légal

aussi : Clarification des responsabilités

PSDT

6.11 Délais du landev hors de
contrôle

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

URBANISME

5.3 Capacité insuffisante en
phase préliminaire

LOCATION

9.7 Approbation à goulot unique

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.11 Équipe légale débordée

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.9 Personnes-pivots uniques

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

AMÉLIORATION DE LA
DISPONIBILITÉ DES
DONNÉES

43

PSDT

6.6 Savoir enfermé dans les têtes

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

PSDT

6.7 Répondre sans cesse aux
mêmes questions

aussi : Élimination des activités à valeur
non ajoutée

PSDT

6.8 Recherche de terrain sur des
données publiques dispersées

aussi : Intégration de systèmes

PSDT

6.11 Délais du landev hors de
contrôle

aussi : Gestion de la capacité

URBANISME

5.7 Réglementation municipale
hétérogène

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

5.9 Information existante mais
inaccessible

aussi : Intégration de systèmes

INTÉGRATION DE
SYSTÈMES

PSDT

6.8 Recherche de terrain
données publiques dispersées

aussi : Amélioration de la disponibilité
des données

PSDT

6.2 Ressaisie multiple
documents déconnectés

aussi : Automatisation

URBANISME

5.9 Information existante
inaccessible

aussi : Amélioration de la disponibilité
des données

LOCATION

9.4 Import manuel des
externes

aussi : Automatisation

LOCATION

9.8 Aucune visibilité sur
l'avancement interne

aussi : Amélioration de la disponibilité
des données

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.5 Rework des itérations

aussi : Élimination des activités à valeur
non ajoutée

CATÉGORIE 2 DE 9

Simplification de processus : réduire le nombre d'étapes, d'allers-retours et d'approbations.



Simplification de processus
CATÉGORIE DE PISTE



Menu

Rapport des objectifs

Capacité des ressources

Projets d'amélioration continue

Gantt des mandats

Systèmes

Kanban des pistes

CHACQUE GOULOT D'ÉTRANGLEMENT EST CLASSÉ DANS UNE OU DEUX CATÉGORIES DE PISTE. GLISSER UNE CARTE POUR LA RECLASSER, CLIQUER POUR GÉRER LE PROJET.

DÉPARTEMENT

Tous les départements

PROJET

Tous

146 goulots - 0 projet d'amélioration

STANDARDISATION DES
NOMENCLATURES ET
GABARITS

39

PSDT

6.6 Savoir enfermé dans les têtes

aussi : Amélioration de la disponibilité des données

PSDT

6.3 Deal sheet parfois sauté, risque accru

aussi : Simplification de processus

PSDT

6.4 Outil de pré-qualification abandonné

aussi : Automatisation

PSDT

6.12 Transfert au Développement sans document

aussi : Clarification des responsabilités

URBANISME

5.2 Risque d'erreur aux conséquences de plusieurs mois

aussi : Automatisation

URBANISME

5.5 Rapports argumentaires refaits dans InDesign

aussi : Élimination des activités à valeur non ajoutée

CLARIFICATION DES
RESPONSABILITÉS

28

PSDT

6.10 Dépendance au légal

aussi : Gestion de la capacité

PSDT

6.12 Transfert au Développement sans document

aussi : Standardisation des nomenclatures et gabarits

PSDT

6.13 Dossiers abandonnés laissés sans sommaire

aussi : Simplification de processus

URBANISME

5.8 Workflow inversé avec le Design

aussi : Simplification de processus

LOCATION

9.7 Approbation à goulot unique

aussi : Gestion de la capacité

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.11 Équipe légale débordée

aussi : Gestion de la capacité

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.14 Handoffs internes déficients

aussi : Standardisation des nomenclatures

GESTION DE LA CAPACITÉ

17

PSDT

6.9 Dépendance à la chaîne design, estimé, pro forma

aussi : Simplification de processus

PSDT

6.10 Dépendance au légal

aussi : Clarification des responsabilités

PSDT

6.11 Délais du landev hors de contrôle

aussi : Amélioration de la disponibilité des données

URBANISME

5.3 Capacité insuffisante en phase préliminaire

LOCATION

9.7 Approbation à goulot unique

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.11 Équipe légale débordée

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.9 Personnes-pivots uniques

aussi : Standardisation des nomenclatures et gabarits

AMÉLIORATION DE LA
DISPONIBILITÉ DES
DONNÉES

43

PSDT

6.6 Savoir enfermé dans les têtes

aussi : Standardisation des nomenclatures et gabarits

PSDT

6.7 Répondre sans cesse aux mêmes questions

aussi : Élimination des activités à valeur non ajoutée

PSDT

6.8 Recherche de terrain sur des données publiques dispersées

aussi : Intégration de systèmes

PSDT

6.11 Délais du landev hors de contrôle

aussi : Gestion de la capacité

URBANISME

5.7 Réglementation municipale hétérogène

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

5.9 Information existante mais inaccessible

aussi : Intégration de systèmes

INTÉGRATION DE
SYSTÈMES

35

PSDT

6.8 Recherche de terrain sur des données publiques dispersées

aussi : Amélioration de la disponibilité des données

PSDT

6.2 Ressaisie multiple dans des documents déconnectés

aussi : Automatisation

URBANISME

5.9 Information existante mais inaccessible

aussi : Amélioration de la disponibilité des données

LOCATION

9.4 Import manuel des listes externes

aussi : Automatisation

LOCATION

9.8 Aucune visibilité sur l'avancement interne

aussi : Amélioration de la disponibilité des données

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.5 Rework des itérations client

aussi : Élimination des activités à valeur non ajoutée

AUTOMATISATION

PSDT

6.1 Synthèse manuelle diligence

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

PSDT

6.5 Comparaison manuelle versions Word

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

PSDT

6.2 Ressaisie multiple documents déconnectés

aussi : Intégration de systèmes

PSDT

6.4 Outil de pré-qualification abandonné

aussi : Standardisation des nomenclatures et gabarits

URBANISME

5.1 Montage de la check-list réglementaire

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

5.4 Revalidation complète chaque version

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

Standardisation des nomenclatures et gabarits : adopter des gabarits, des codifications et des nomenclatures communes.



Standardisation des nomenclatures et gabarits

CATÉGORIE DE PISTE



Menu

Rapport des objectifs

Capacité des ressources

Projets d'amélioration continue

Gantt des mandats

Systèmes

Kanban des pistes

CHACQUE GOULOT D'ÉTRANGLEMENT EST CLASSÉ DANS UNE OU DEUX CATÉGORIES DE PISTE. GLISSER UNE CARTE POUR LA RECLASSER, CLIQUER POUR GÉRER LE PROJET.

DÉPARTEMENT

Tous les départements

PROJET

Tous

146 goulots - 0 projet d'amélioration

CLARIFICATION DES RESPONSABILITÉS

28

PSDT

6.10 Dépendance au légal

aussi : Gestion de la capacité

PSDT

6.12 Transfert au Développement sans document

aussi : Standardisation des nomenclatures et gabarits

PSDT

6.13 Dossiers abandonnés laissés sans sommaire

aussi : Simplification de processus

URBANISME

5.8 Workflow inversé avec le Design

aussi : Simplification de processus

LOCATION

9.7 Approbation à goulot unique

aussi : Gestion de la capacité

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.11 Équipe légale débordée

aussi : Gestion de la capacité

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.14 Handoffs internes déficients

aussi : Standardisation des nomenclatures

GESTION DE LA CAPACITÉ

17

PSDT

6.9 Dépendance à la chaîne design, estimé, pro forma

aussi : Simplification de processus

PSDT

6.10 Dépendance au légal

aussi : Clarification des responsabilités

PSDT

6.11 Délais du landev hors de contrôle

aussi : Amélioration de la disponibilité des données

URBANISME

5.3 Capacité insuffisante en phase préliminaire

LOCATION

9.7 Approbation à goulot unique

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.11 Équipe légale débordée

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.9 Personnes-pivots uniques

aussi : Standardisation des nomenclatures et gabarits

AMÉLIORATION DE LA DISPONIBILITÉ DES DONNÉES

43

PSDT

6.6 Savoir enfermé dans les têtes

aussi : Standardisation des nomenclatures et gabarits

PSDT

6.7 Répondre sans cesse aux mêmes questions

aussi : Élimination des activités à valeur non ajoutée

PSDT

6.8 Recherche de terrain sur des données publiques dispersées

aussi : Intégration de systèmes

PSDT

6.11 Délais du landev hors de contrôle

aussi : Gestion de la capacité

URBANISME

5.7 Réglementation municipale hétérogène

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

5.9 Information existante mais inaccessible

aussi : Intégration de systèmes

INTÉGRATION DE SYSTÈMES

35

PSDT

6.8 Recherche de terrain sur des données publiques dispersées

aussi : Amélioration de la disponibilité des données

PSDT

6.2 Ressaisie multiple dans des documents déconnectés

aussi : Automatisation

URBANISME

5.9 Information existante mais inaccessible

aussi : Amélioration de la disponibilité des données

LOCATION

9.4 Import manuel des listes externes

aussi : Automatisation

LOCATION

9.8 Aucune visibilité sur l'avancement interne

aussi : Amélioration de la disponibilité des données

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.5 Rework des itérations client

aussi : Élimination des activités à valeur non ajoutée

AUTOMATISATION

48

PSDT

6.1 Synthèse manuelle de la due diligence

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

PSDT

6.5 Comparaison manuelle des versions Word

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

PSDT

6.2 Ressaisie multiple dans des documents déconnectés

aussi : Intégration de systèmes

PSDT

6.4 Outil de pré-qualification abandonné

aussi : Standardisation des nomenclatures et gabarits

URBANISME

5.1 Montage de la checklist réglementaire

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

5.4 Revalidation complète à chaque version

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

INTÉGRATION D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

PSDT

6.1 Synthèse manuelle diligence

aussi : Automatisation

PSDT

6.5 Comparaison man versions Word

aussi : Automatisation

URBANISME

5.1 Montage de la chec réglementaire

aussi : Automatisation

URBANISME

5.4 Revalidation compl chaque version

aussi : Automatisation

URBANISME

5.6 Essais d'outils IA d

URBANISME

5.7 Réglementation mu hétérogène

aussi : Amélioration de la dis données

LOCATION

Clarification des responsabilités : préciser qui décide, qui exécute et qui valide à chaque étape.



Clarification des responsabilités
CATÉGORIE DE PISTE



Menu

Rapport des objectifs

Capacité des ressources

Projets d'amélioration continue

Gantt des mandats

Systèmes

Kanban des pistes

CHAQUE GOULOT D'ÉTRANGLEMENT EST CLASSÉ DANS UNE OU DEUX CATÉGORIES DE PISTE. GLISSER UNE CARTE POUR LA RECLASSER, CLIQUER POUR GÉRER LE PROJET.

DÉPARTEMENT

Tous les départements

PROJET

Tous

146 goulots - 0 projet d'amélioration

ÉVALUATION DES
CAPACITÉS

28

GESTION DE LA CAPACITÉ

17

AMÉLIORATION DE LA
DISPONIBILITÉ DES
DONNÉES

43

INTÉGRATION DE
SYSTÈMES

35

AUTOMATISATION

48

INTÉGRATION
D'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

26

PSDT

6.9 Dépendance à la chaîne
design, estimé, pro forma

aussi : Simplification de processus

PSDT

6.10 Dépendance au légal

aussi : Clarification des responsabilités

PSDT

6.11 Délais du landev hors de
contrôle

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

URBANISME

5.3 Capacité insuffisante en
phase préliminaire

LOCATION

9.7 Approbation à goulot unique

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.11 Équipe légale débordée

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.9 Personnes-pivots uniques

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

PSDT

6.6 Savoir enfermé dans les têtes

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

PSDT

6.7 Répondre sans cesse aux
mêmes questions

aussi : Élimination des activités à valeur
non ajoutée

PSDT

6.8 Recherche de terrain sur des
données publiques dispersées

aussi : Intégration de systèmes

PSDT

6.11 Délais du landev hors de
contrôle

aussi : Gestion de la capacité

URBANISME

5.7 Réglementation municipale
hétérogène

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

5.9 Information existante mais
inaccessible

aussi : Intégration de systèmes

PSDT

6.8 Recherche de terrain sur des
données publiques dispersées

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

PSDT

6.2 Ressaisie multiple dans des
documents déconnectés

aussi : Automatisation

URBANISME

5.9 Information existante mais
inaccessible

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

LOCATION

9.4 Import manuel des listes
externes

aussi : Automatisation

LOCATION

9.8 Aucune visibilité sur
l'avancement interne

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.5 Rework des itérations client

aussi : Élimination des activités à valeur
non ajoutée

PSDT

6.1 Synthèse manuelle de la due
diligence

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

PSDT

6.5 Comparaison manuelle des
versions Word

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

PSDT

6.2 Ressaisie multiple dans des
documents déconnectés

aussi : Intégration de systèmes

PSDT

6.4 Outil de pré-qualification
abandonné

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

URBANISME

5.1 Montage de la checklist
réglementaire

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

5.4 Revalidation complète à
chaque version

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

PSDT

6.1 Synthèse manuelle de la due
diligence

aussi : Automatisation

PSDT

6.5 Comparaison manuelle des
versions Word

aussi : Automatisation

URBANISME

5.1 Montage de la checklist
réglementaire

aussi : Automatisation

URBANISME

5.4 Revalidation complète à
chaque version

aussi : Automatisation

URBANISME

5.6 Essais d'outils IA décevants

URBANISME

5.7 Réglementation municipale
hétérogène

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

LOCATION

CATÉGORIE 5 DE 9

Gestion de la capacité : dimensionner les ressources et lisser la charge de travail.



Gestion de la capacité
CATÉGORIE DE PISTE



Menu

Rapport des objectifs

Capacité des ressources

Projets d'amélioration continue

Gantt des mandats

Systèmes

Kanban des pistes

CHAQUE GOULOT D'ÉTRANGLEMENT EST CLASSÉ DANS UNE OU DEUX CATÉGORIES DE PISTE. GLISSER UNE CARTE POUR LA RECLASSER, CLIQUER POUR GÉRER LE PROJET.

DÉPARTEMENT

Tous les départements

PROJET

Tous

146 goulots - 0 projet d'amélioration

ATION DES
BILITÉS

28

GESTION DE LA CAPACITÉ

17

AMÉLIORATION DE LA
DISPONIBILITÉ DES
DONNÉES

43

INTÉGRATION DE
SYSTÈMES

35

AUTOMATISATION

48

INTÉGRATION
D'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

26

PSDT

6.9 Dépendance à la chaîne
design, estimé, pro forma

aussi : Simplification de processus

PSDT

6.10 Dépendance au légal

aussi : Clarification des responsabilités

PSDT

6.11 Délais du landev hors de
contrôle

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

URBANISME

5.3 Capacité insuffisante en
phase préliminaire

LOCATION

9.7 Approbation à goulot unique

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.11 Équipe légale débordée

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.9 Personnes-pivots uniques

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

PSDT

6.6 Savoir enfermé dans les têtes

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

PSDT

6.7 Répondre sans cesse aux
mêmes questions

aussi : Élimination des activités à valeur
non ajoutée

PSDT

6.8 Recherche de terrain sur des
données publiques dispersées

aussi : Intégration de systèmes

PSDT

6.11 Délais du landev hors de
contrôle

aussi : Gestion de la capacité

URBANISME

5.7 Réglementation municipale
hétérogène

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

5.9 Information existante mais
inaccessible

aussi : Intégration de systèmes

PSDT

6.8 Recherche de terrain sur des
données publiques dispersées

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

PSDT

6.2 Ressaisie multiple dans des
documents déconnectés

aussi : Automatisation

URBANISME

5.9 Information existante mais
inaccessible

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

LOCATION

9.4 Import manuel des listes
externes

aussi : Automatisation

LOCATION

9.8 Aucune visibilité sur
l'avancement interne

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.5 Rework des itérations client

aussi : Élimination des activités à valeur
non ajoutée

PSDT

6.1 Synthèse manuelle de la due
diligence

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

PSDT

6.5 Comparaison manuelle des
versions Word

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

PSDT

6.2 Ressaisie multiple dans des
documents déconnectés

aussi : Intégration de systèmes

PSDT

6.4 Outil de pré-qualification
abandonné

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

URBANISME

5.1 Montage de la checklist
réglementaire

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

5.4 Revalidation complète à
chaque version

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

PSDT

6.1 Synthèse manuelle de la due
diligence

aussi : Automatisation

PSDT

6.5 Comparaison manuelle des
versions Word

aussi : Automatisation

URBANISME

5.1 Montage de la checklist
réglementaire

aussi : Automatisation

URBANISME

5.4 Revalidation complète à
chaque version

aussi : Automatisation

URBANISME

5.6 Essais d'outils IA décevants

URBANISME

5.7 Réglementation municipale
hétérogène

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

LOCATION

Amélioration de la disponibilité des données : rendre l'information fiable, centralisée et accessible à ceux qui en ont besoin.



Amélioration de la disponibilité des données
CATÉGORIE DE PISTE



Menu

Rapport des objectifs

Capacité des ressources

Projets d'amélioration continue

Gantt des mandats

Systèmes

Kanban des pistes

CHAQUE GOULOT D'ÉTRANGLEMENT EST CLASSÉ DANS UNE OU DEUX CATÉGORIES DE PISTE. GLISSER UNE CARTE POUR LA RECLASSER, CLIQUER POUR GÉRER LE PROJET.

DÉPARTEMENT

Tous les départements

PROJET

Tous

146 goulots - 0 projet d'amélioration

ATION DES
BILITÉS

28

GESTION DE LA CAPACITÉ

17

AMÉLIORATION DE LA
DISPONIBILITÉ DES
DONNÉES

43

INTÉGRATION DE
SYSTÈMES

35

AUTOMATISATION

48

INTÉGRATION
D'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

26

PSDT

6.9 Dépendance à la chaîne
design, estimé, pro forma

aussi : Simplification de processus

PSDT

6.10 Dépendance au légal

aussi : Clarification des responsabilités

PSDT

6.11 Délais du landev hors de
contrôle

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

URBANISME

5.3 Capacité insuffisante en
phase préliminaire

LOCATION

9.7 Approbation à goulot unique

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.11 Équipe légale débordée

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.9 Personnes-pivots uniques

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

PSDT

6.6 Savoir enfermé dans les têtes

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

PSDT

6.7 Répondre sans cesse aux
mêmes questions

aussi : Élimination des activités à valeur
non ajoutée

PSDT

6.8 Recherche de terrain sur des
données publiques dispersées

aussi : Intégration de systèmes

PSDT

6.11 Délais du landev hors de
contrôle

aussi : Gestion de la capacité

URBANISME

5.7 Réglementation municipale
hétérogène

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

5.9 Information existante mais
inaccessible

aussi : Intégration de systèmes

PSDT

6.8 Recherche de terrain sur des
données publiques dispersées

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

PSDT

6.2 Ressaisie multiple dans des
documents déconnectés

aussi : Automatisation

URBANISME

5.9 Information existante mais
inaccessible

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

LOCATION

9.4 Import manuel des listes
externes

aussi : Automatisation

LOCATION

9.8 Aucune visibilité sur
l'avancement interne

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.5 Rework des itérations client

aussi : Élimination des activités à valeur
non ajoutée

PSDT

6.1 Synthèse manuelle de la due
diligence

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

PSDT

6.5 Comparaison manuelle des
versions Word

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

PSDT

6.2 Ressaisie multiple dans des
documents déconnectés

aussi : Intégration de systèmes

PSDT

6.4 Outil de pré-qualification
abandonné

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

URBANISME

5.1 Montage de la checklist
réglementaire

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

5.4 Revalidation complète à
chaque version

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

PSDT

6.1 Synthèse manuelle de la due
diligence

aussi : Automatisation

PSDT

6.5 Comparaison manuelle des
versions Word

aussi : Automatisation

URBANISME

5.1 Montage de la checklist
réglementaire

aussi : Automatisation

URBANISME

5.4 Revalidation complète à
chaque version

aussi : Automatisation

URBANISME

5.6 Essais d'outils IA décevants

URBANISME

5.7 Réglementation municipale
hétérogène

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

LOCATION

CATÉGORIE 7 DE 9

Intégration de systèmes : faire communiquer les systèmes pour éliminer les ressaisies.



Intégration de systèmes
CATÉGORIE DE PISTE



Menu

Rapport des objectifs

Capacité des ressources

Projets d'amélioration continue

Gantt des mandats

Systèmes

Kanban des pistes

CHAQUE GOULOT D'ÉTRANGLEMENT EST CLASSÉ DANS UNE OU DEUX CATÉGORIES DE PISTE. GLISSER UNE CARTE POUR LA RECLASSER, CLIQUER POUR GÉRER LE PROJET.

DÉPARTEMENT

Tous les départements

PROJET

Tous

146 goulots - 0 projet d'amélioration

ATION DES
BILITÉS

28

GESTION DE LA CAPACITÉ

17

AMÉLIORATION DE LA
DISPONIBILITÉ DES
DONNÉES

43

INTÉGRATION DE
SYSTÈMES

35

AUTOMATISATION

48

INTÉGRATION
D'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

26

PSDT

6.9 Dépendance à la chaîne
design, estimé, pro forma

aussi : Simplification de processus

PSDT

6.10 Dépendance au légal

aussi : Clarification des responsabilités

PSDT

6.11 Délais du landev hors de
contrôle

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

URBANISME

5.3 Capacité insuffisante en
phase préliminaire

LOCATION

9.7 Approbation à goulot unique

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.11 Équipe légale débordée

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.9 Personnes-pivots uniques

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

PSDT

6.6 Savoir enfermé dans les têtes

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

PSDT

6.7 Répondre sans cesse aux
mêmes questions

aussi : Élimination des activités à valeur
non ajoutée

PSDT

6.8 Recherche de terrain sur des
données publiques dispersées

aussi : Intégration de systèmes

PSDT

6.11 Délais du landev hors de
contrôle

aussi : Gestion de la capacité

URBANISME

5.7 Réglementation municipale
hétérogène

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

5.9 Information existante mais
inaccessible

aussi : Intégration de systèmes

PSDT

6.8 Recherche de terrain sur des
données publiques dispersées

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

PSDT

6.2 Ressaisie multiple dans des
documents déconnectés

aussi : Automatisation

URBANISME

5.9 Information existante mais
inaccessible

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

LOCATION

9.4 Import manuel des listes
externes

aussi : Automatisation

LOCATION

9.8 Aucune visibilité sur
l'avancement interne

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1.5 Rework des itérations client

aussi : Élimination des activités à valeur
non ajoutée

PSDT

6.1 Synthèse manuelle de la due
diligence

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

PSDT

6.5 Comparaison manuelle des
versions Word

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

PSDT

6.2 Ressaisie multiple dans des
documents déconnectés

aussi : Intégration de systèmes

PSDT

6.4 Outil de pré-qualification
abandonné

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

URBANISME

5.1 Montage de la checklist
réglementaire

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

5.4 Revalidation complète à
chaque version

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

PSDT

6.1 Synthèse manuelle de la due
diligence

aussi : Automatisation

PSDT

6.5 Comparaison manuelle des
versions Word

aussi : Automatisation

URBANISME

5.1 Montage de la checklist
réglementaire

aussi : Automatisation

URBANISME

5.4 Revalidation complète à
chaque version

aussi : Automatisation

URBANISME

5.6 Essais d'outils IA décevants

URBANISME

5.7 Réglementation municipale
hétérogène

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

LOCATION

Automatisation : confier aux systèmes les tâches répétitives et les relances.



Automatisation

CATÉGORIE DE PISTE



Menu

Rapport des objectifs

Capacité des ressources

Projets d'amélioration continue

Gantt des mandats

Systèmes

Kanban des pistes

CHAQUE GOULOT D'ÉTRANGLEMENT EST CLASSÉ DANS UNE OU DEUX CATÉGORIES DE PISTE. GLISSER UNE CARTE POUR LA RECLASSER, CLIQUER POUR GÉRER LE PROJET.

DÉPARTEMENT

Tous les départements

PROJET

Tous

146 goulots - 0 projet d'amélioration

ÉVALUATION DES
CAPACITÉS

28

GESTION DE LA CAPACITÉ

17

AMÉLIORATION DE LA
DISPONIBILITÉ DES
DONNÉES

43

INTÉGRATION DE
SYSTÈMES

35

AUTOMATISATION

48

INTÉGRATION
D'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

26

Dépendance au légal

Gestion de la capacité

Expert au Développement
Interne

Standardisation des nomenclatures

Processus abandonnés laissés
à l'abandon

Optimisation de processus

Flux inverse avec le

Optimisation de processus

Optimisation à goulot unique

Gestion de la capacité

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
Équipe légale débordée

Gestion de la capacité

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
Efforts internes déficients

Standardisation des nomenclatures

PSDT
6.9 Dépendance à la chaîne
design, estimé, pro forma

aussi : Simplification de processus

PSDT
6.10 Dépendance au légal

aussi : Clarification des responsabilités

PSDT
6.11 Délais du landev hors de
contrôle

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

URBANISME
5.3 Capacité insuffisante en
phase préliminaire

LOCATION
9.7 Approbation à goulot unique

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
1.11 Équipe légale débordée

aussi : Clarification des responsabilités

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
1.9 Personnes-pivots uniques

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

PSDT
6.6 Savoir enfermé dans les têtes

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

PSDT
6.7 Répondre sans cesse aux
mêmes questions

aussi : Élimination des activités à valeur
non ajoutée

PSDT
6.8 Recherche de terrain sur des
données publiques dispersées

aussi : Intégration de systèmes

PSDT
6.11 Délais du landev hors de
contrôle

aussi : Gestion de la capacité

URBANISME
5.7 Réglementation municipale
hétérogène

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME
5.9 Information existante mais
inaccessible

aussi : Intégration de systèmes

PSDT
6.8 Recherche de terrain sur des
données publiques dispersées

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

PSDT
6.2 Ressaisie multiple dans des
documents déconnectés

aussi : Automatisation

URBANISME
5.9 Information existante mais
inaccessible

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

LOCATION
9.4 Import manuel des listes
externes

aussi : Automatisation

LOCATION
9.8 Aucune visibilité sur
l'avancement interne

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
1.5 Rework des itérations client

aussi : Élimination des activités à valeur
non ajoutée

PSDT
6.1 Synthèse manuelle de la due
diligence

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

PSDT
6.5 Comparaison manuelle des
versions Word

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

PSDT
6.2 Ressaisie multiple dans des
documents déconnectés

aussi : Intégration de systèmes

PSDT
6.4 Outil de pré-qualification
abandonné

aussi : Standardisation des nomenclatures
et gabarits

URBANISME
5.1 Montage de la checklist
réglementaire

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME
5.4 Revalidation complète à
chaque version

aussi : Intégration d'intelligence artificielle

URBANISME

PSDT
6.1 Synthèse manuelle de la due
diligence

aussi : Automatisation

PSDT
6.5 Comparaison manuelle des
versions Word

aussi : Automatisation

URBANISME
5.1 Montage de la checklist
réglementaire

aussi : Automatisation

URBANISME
5.4 Revalidation complète à
chaque version

aussi : Automatisation

URBANISME
5.6 Essais d'outils IA décevants

URBANISME
5.7 Réglementation municipale
hétérogène

aussi : Amélioration de la disponibilité des
données

LOCATION

CATÉGORIE 9 DE 9

Intégration d'intelligence artificielle : utiliser l'intelligence artificielle pour lire, synthétiser et proposer.



Intégration d'intelligence artificielle
CATÉGORIE DE PISTE



Menu

Rapport des objectifs

Capacité des ressources

Projets d'amélioration continue


Gantt des mandats

Systèmes

Gantt des mandats d'amélioration

CHAQUE MANDAT REGROUPE PLUSIEURS GOULOTS D'ÉTRANGLEMENT. LA PRIORITÉ DÉCOULE DE L'OBJECTIF GLOBAL QU'IL SERT.

Objectif global servi : 1 G\$ d'actifs stabilisés hors Québec en trois ans 25 M pi² de terrain développable disponible en permanence 14 à 16 % de profitabilité sur les contrats de construction 1 M pi² loués dans le portefeuille

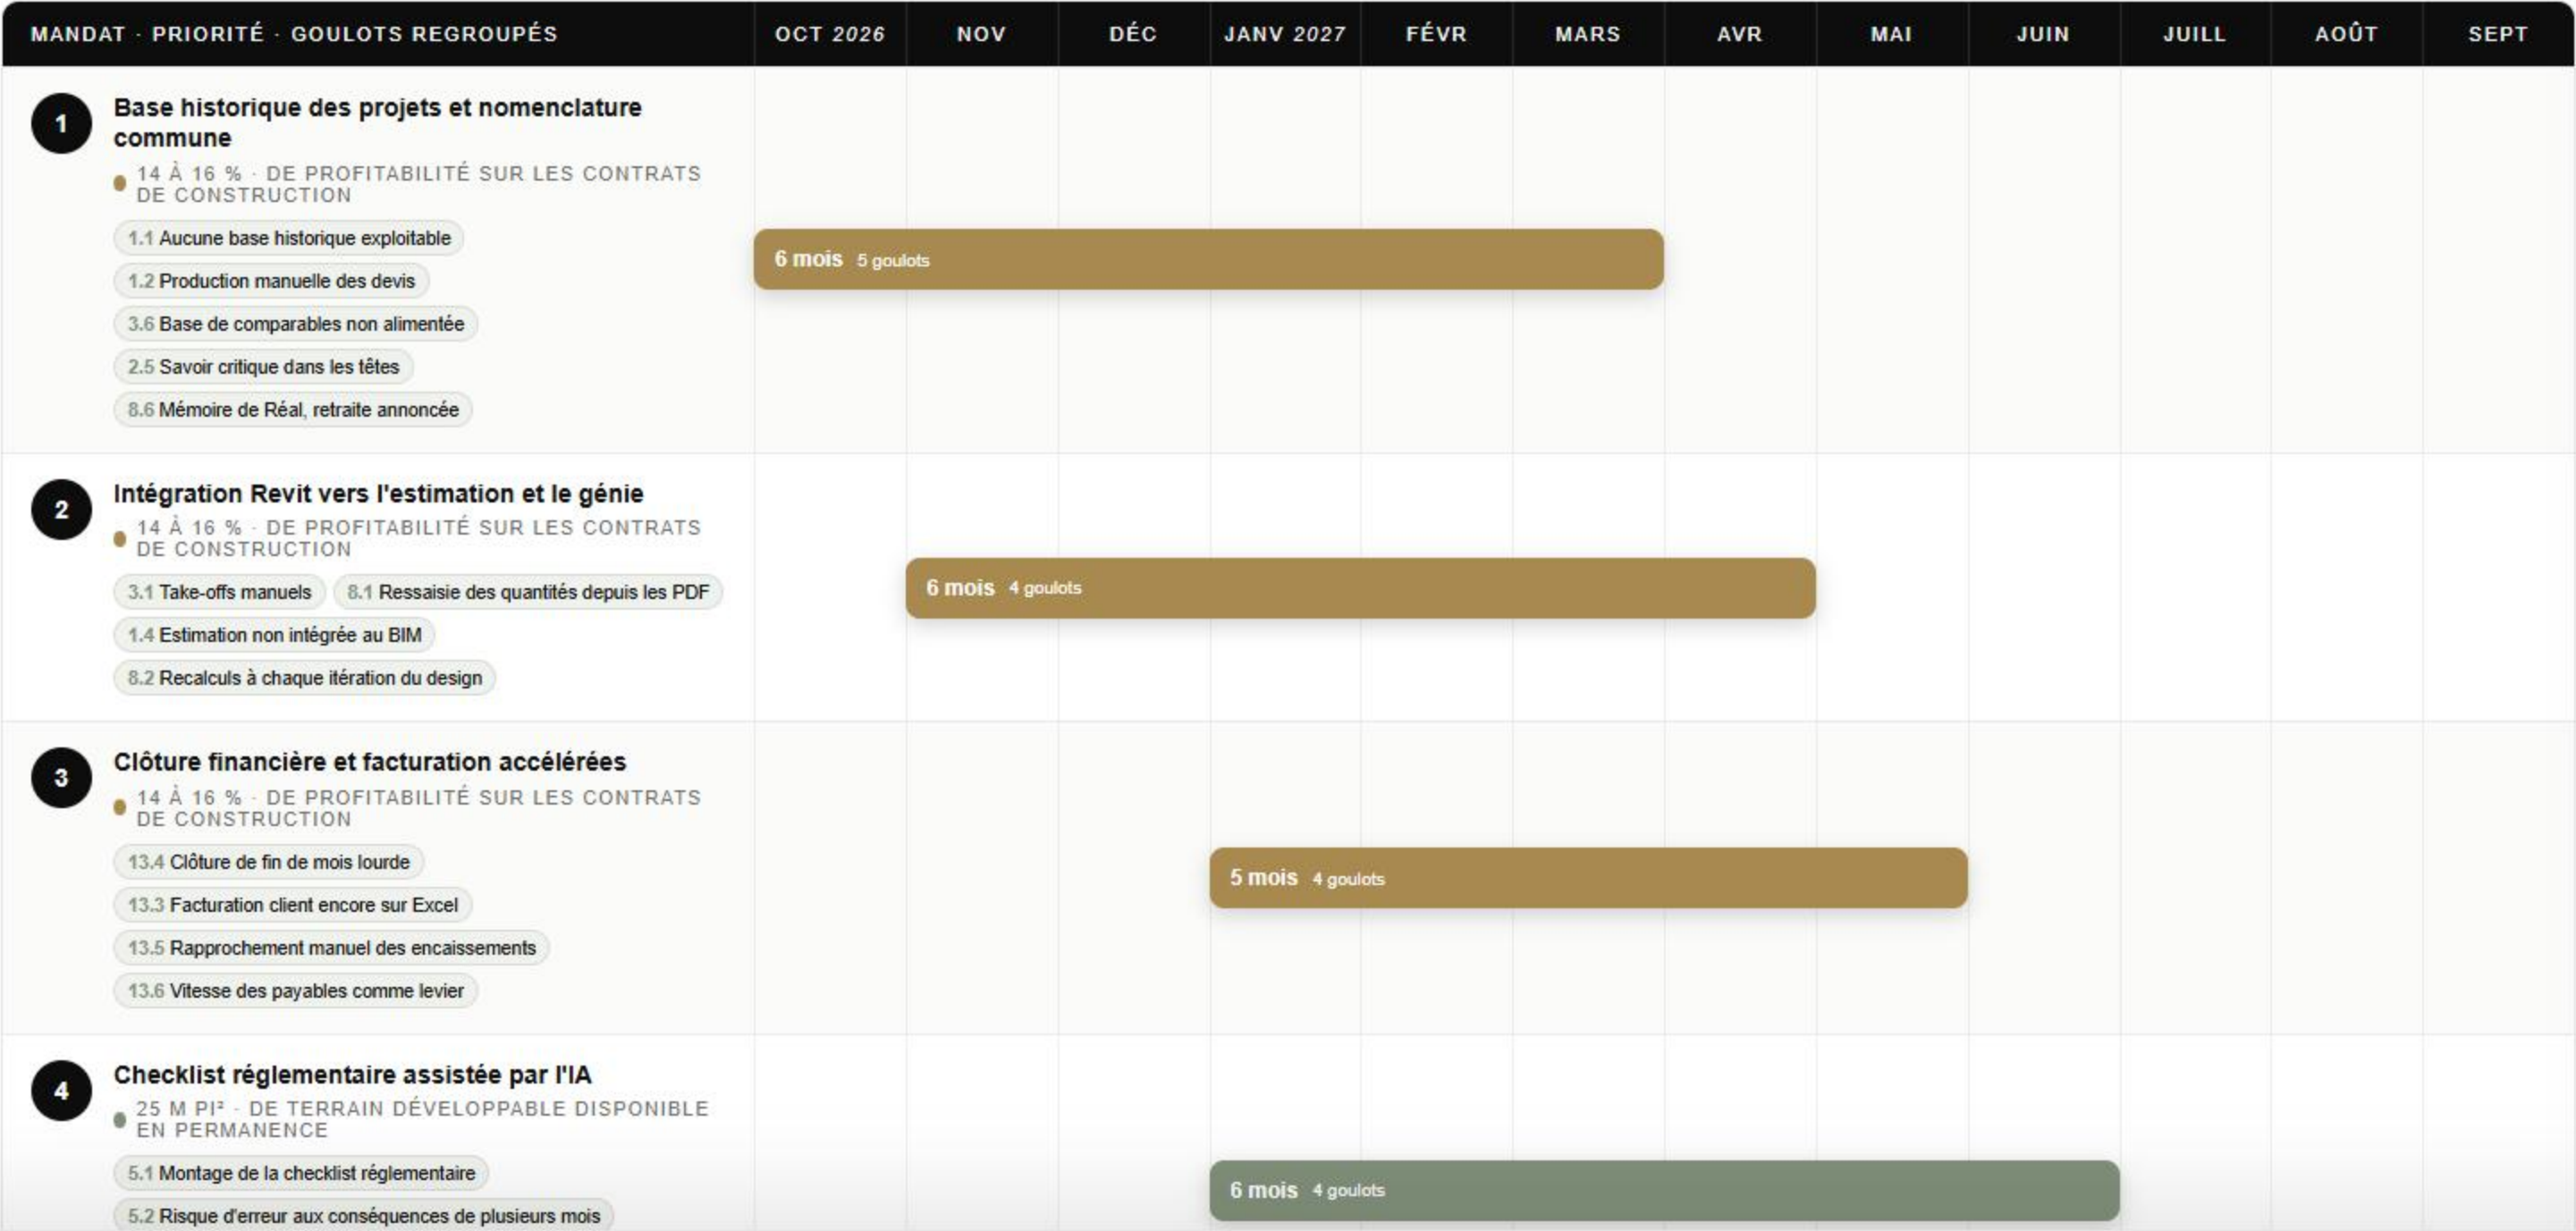

PRIORISATION DES MANDATS

En fonction des objectifs globaux, nous pouvons établir la priorisation des mandats d'amélioration pour accélérer la performance opérationnelle.



Les objectifs globaux
GUIDENT LA PRIORITÉ



Un mandat
REGROUPE PLUSIEURS GOULOTS



Un calendrier
POUR ACCÉLÉRER LA PERFORMANCE

